

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 18/05/2026 Inspecteur: Michel Mergan Mentor: Installateur: -ASS bv
ID-label: B.T.W. nr.:- Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
Eurotest ET61557 Serienummer: 19481286

Datum verslag: 18/05/2026

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 2351390

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Rasphuisstraat
Huisnummer 1
Busnummer 001
Postcode 9000
Gemeente GENT
Land België

Eigenaar

Naam Thuishandel Bv
Straatnaam Rasphuisstraat
Huisnummer 1
Busnummer 001
Postcode 9000
Gemeente GENT
Land België

Installateur

Naam -ASS bv
BTW nr. BE 0890 117 926
Telefoonnummer +32 488 00 56 56
E-mail aft03@hotmail.com

EA N : 541448860023994816

Teller Nr.: : 1LGZ0542448651

Type : appartement
Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor ja
01/06/2023?

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 15
Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 2.06 MΩ RE: 7.21 Ω

OK OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	15	-	-
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
11	C	20		2	2,5
1	C	25		4	4
3	C	16		2	1,5
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N13 De ruimte die een bad en/of douche bevat (zoals bedoeld in hoofdstuk 7.1. van het AREI, Boek 1), was nog niet (volledig) afgewerkt. Wij konden ons bijgevolg niet uitspreken over de conformiteit van de elektrische installatie in deze ruimte. Een bijkomende gelijkvormigheidscontrole van deze installatie is nodig en dient aangevraagd te worden door de eigenaar, beheerder of uitbater na afwerking en vóór de ingebruikname van deze installatie.
- N16 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieelschakelaars kon niet getest worden.
- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N38 Toestellen niet geplaatst op moment van controle. Maximaal vermogen kon niet worden nagekeken ter bepaling van het gebruik van de kring (Boek 1 onderafdeling 5.2.1.2.)
- N5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

Arbeidsmiddelen van welke aard ook zijn niet in de controle omvat.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 18/5/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.
Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 11

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 15:32 tot 16:21
De inspecteur Michel Mergan

Mergan Michel - ACEG

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 18/5/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.










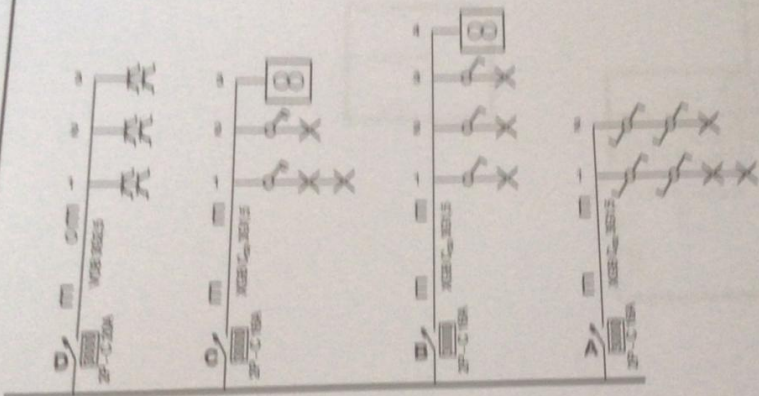

Meyan M
98-05-2026
ACR6

Plaats van de elektrische installatie
HUISHANDEL BV
RASPHUISSTRAAT 1 Bus 001
9000 GENT
0508666889
EAN 54144880023094816

Installateur
A.S.S. bv
Land van Weaslaan 145 bus 001
9040 Sint-Amandsberg
Tel.: 0476 39 77 61
e-mail: info@assbouw.be
BE0867243247

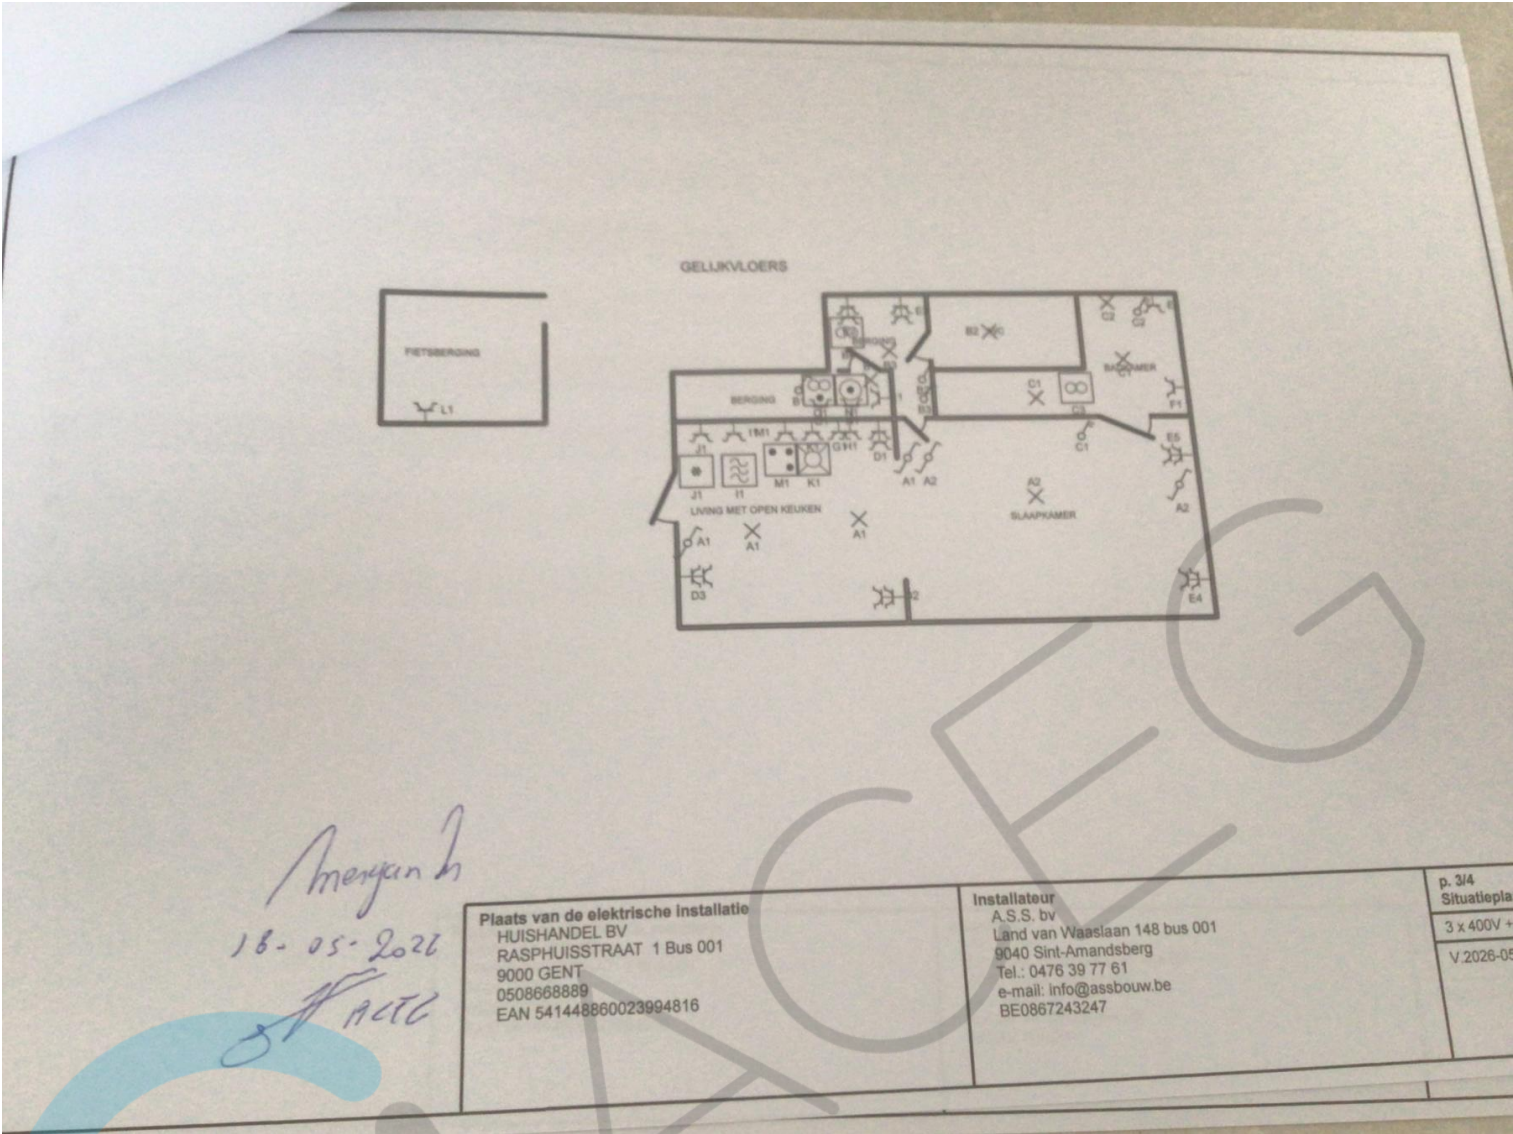

Mergin In
18-05-2020
J. A. C. C.

