

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 18/12/2023

Inspecteur: Thomas Kindt

Mentor: -

Installateur: Valencyn William BVBA

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0684 700 927

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102  
BT

Serienummer: 23021908

Datum verslag: 19/12/2023

### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Fritz de Beulestraat  
Huisnummer 18  
Busnummer AD  
Postcode 9000  
Gemeente Gent  
Land België

### Eigenaar

Naam Valencyn William BVBA  
Straatnaam Fritz de Beulestraat  
Huisnummer 18  
Busnummer AD  
Postcode 9000  
Gemeente Gent  
Land België

### Installateur

Naam Valencyn William BVBA  
BTW nr. BE 0684 700 927  
Telefoonnummer +32 473 46 02 86  
E-mail valencynelectronics@gmail.com

Type : niet huishoudelijke installatie (winkel pand, kantoor, restaurant)  $\leq$  63A

EAN : 541448860022885245

Teller Nr. : 1SAG1100670758

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



### Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een niet huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1-9.1.1, 6.4. en 4.2.4.4.

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Ja

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm<sup>2</sup>

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 2


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: >999 M $\Omega$

RE: 7.94  $\Omega$

OK

OK



**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

$\Delta I$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I <sub>st</sub>	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	2	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	2	NVT	NVT

**BESCHRIJVING INSTALLATIE**

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm <sup>2</sup> )
2	C	16		2	1,5

<b>Visueel nazicht (algemeen)</b>	OK	<b>Directe aanraking</b>	OK	<b>Indirecte aanraking</b>	OK
<b>Aansluitingen</b>	OK	<b>schema in bijlage door Aceg vzw</b>	NA		
<b>Equipotentiale verbindingen</b>	OK	<b>Doorsnede geleiders</b>	OK		
<b>Continuïteit</b>	OK	<b>Verlichting / toestellen</b>	NVT		
<b>Uitwendige invloeden</b>	OK				

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

**BESLUIT**

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 18/12/2028
    - De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
    - Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.  
Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 6

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Thomas Kindt



**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.1.**

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.  
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.  
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

**Kwaliteit**


De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.  
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


**Stappenplan voor een installatie die conform is:**


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 18/12/2028	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

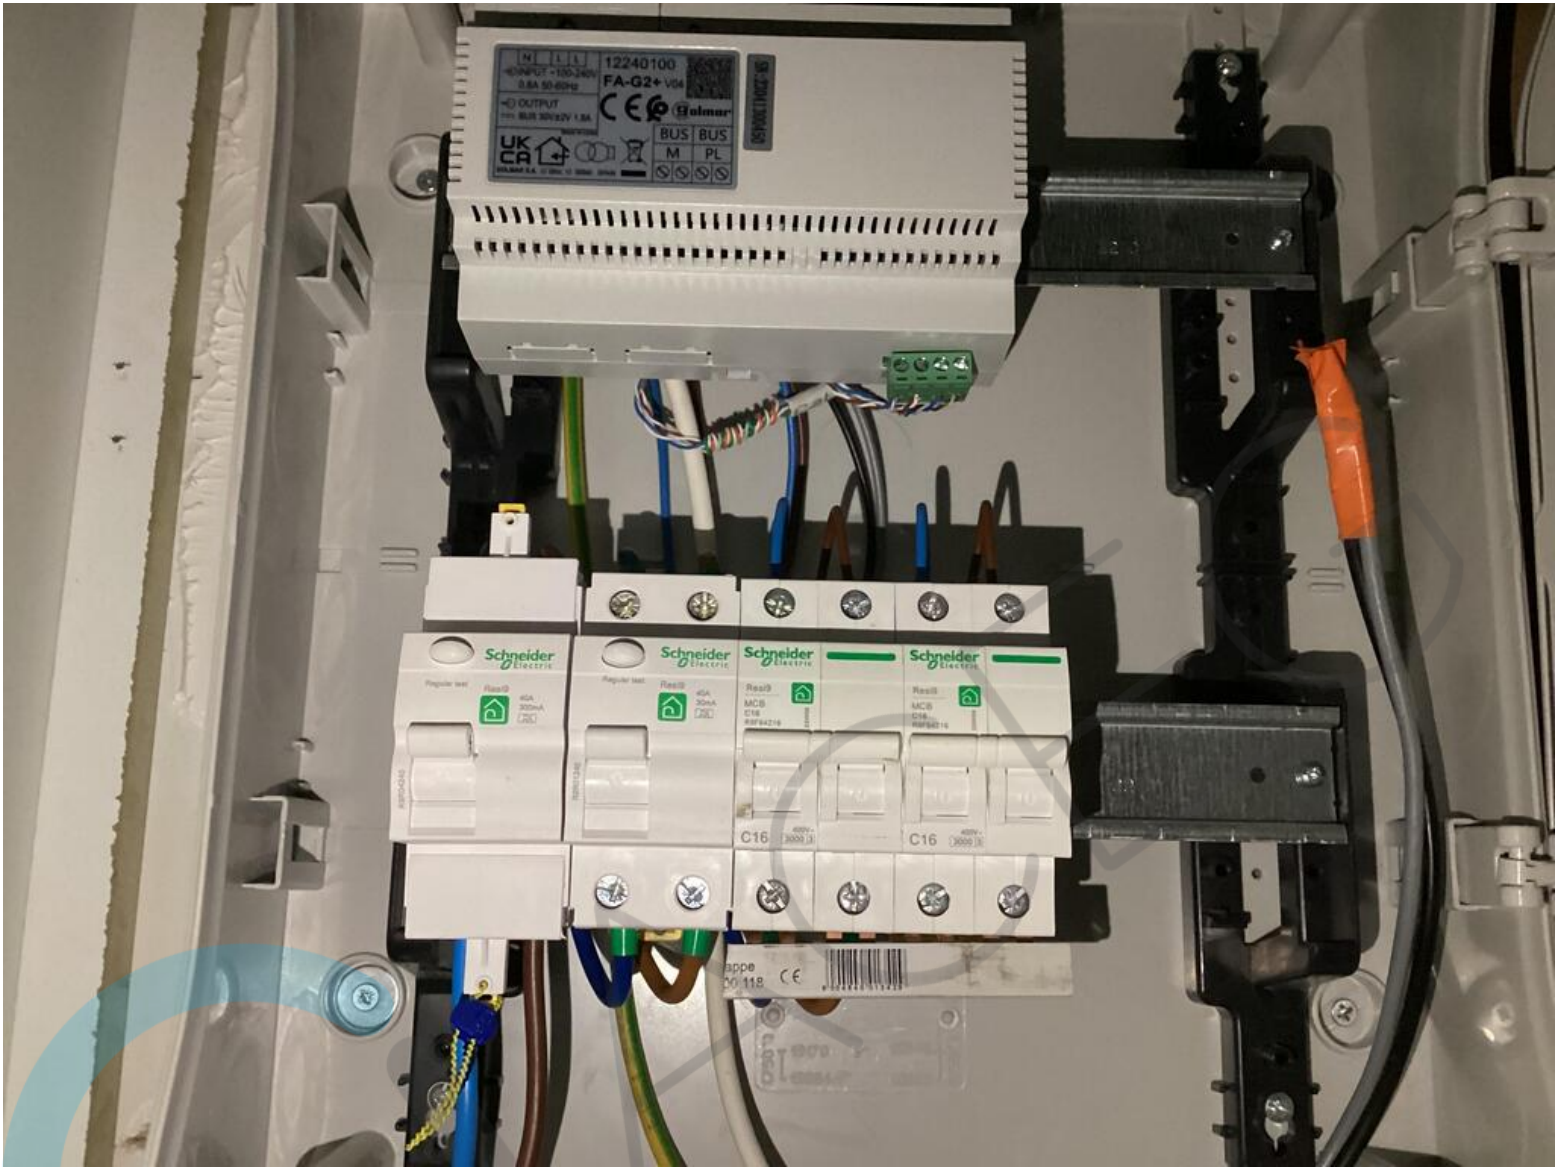






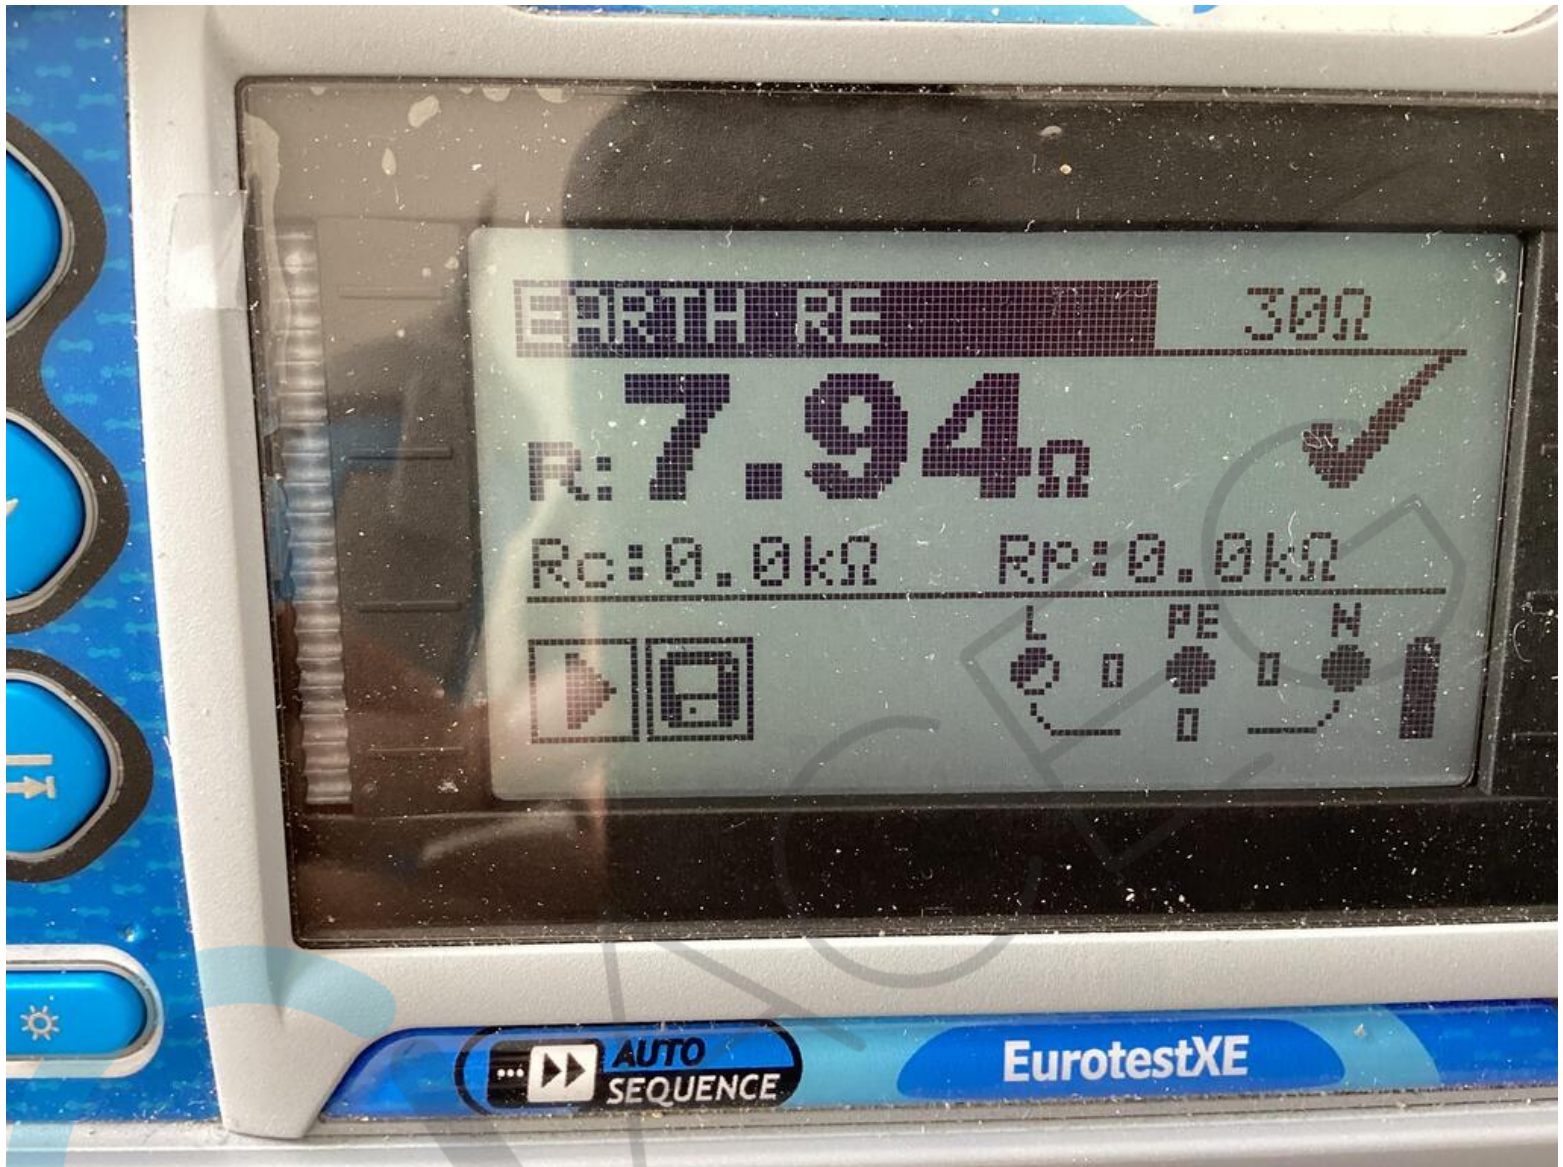

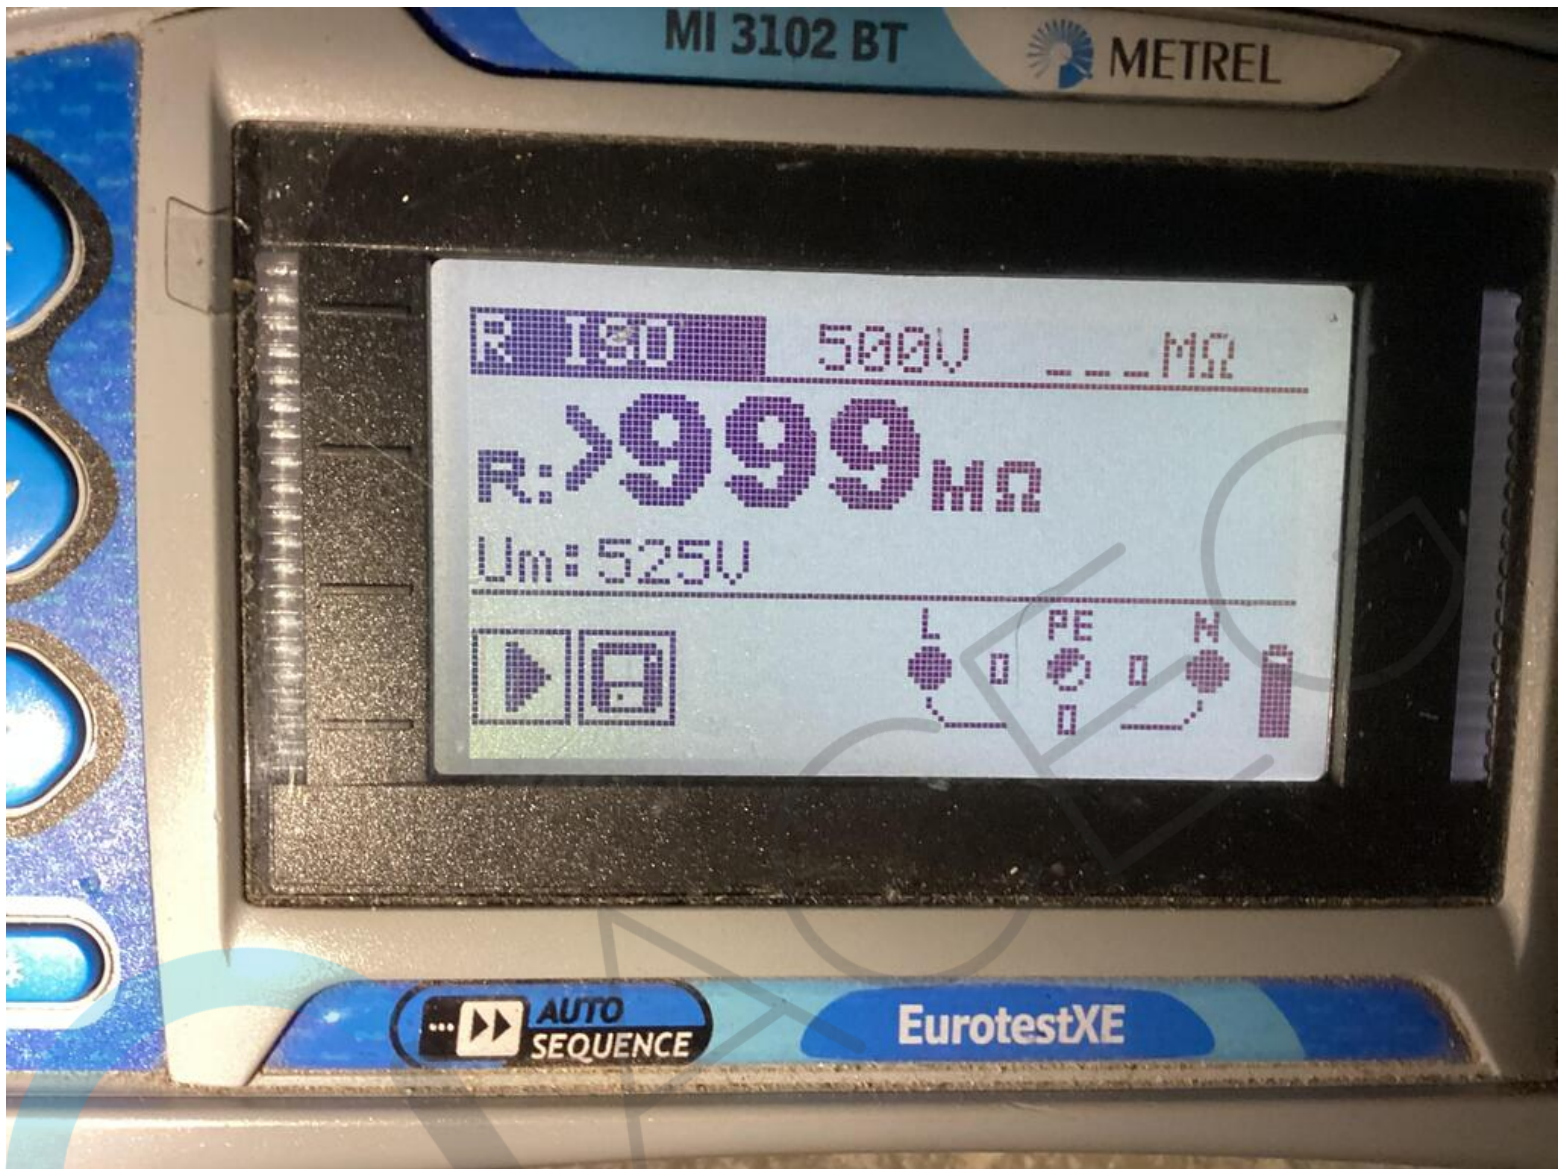

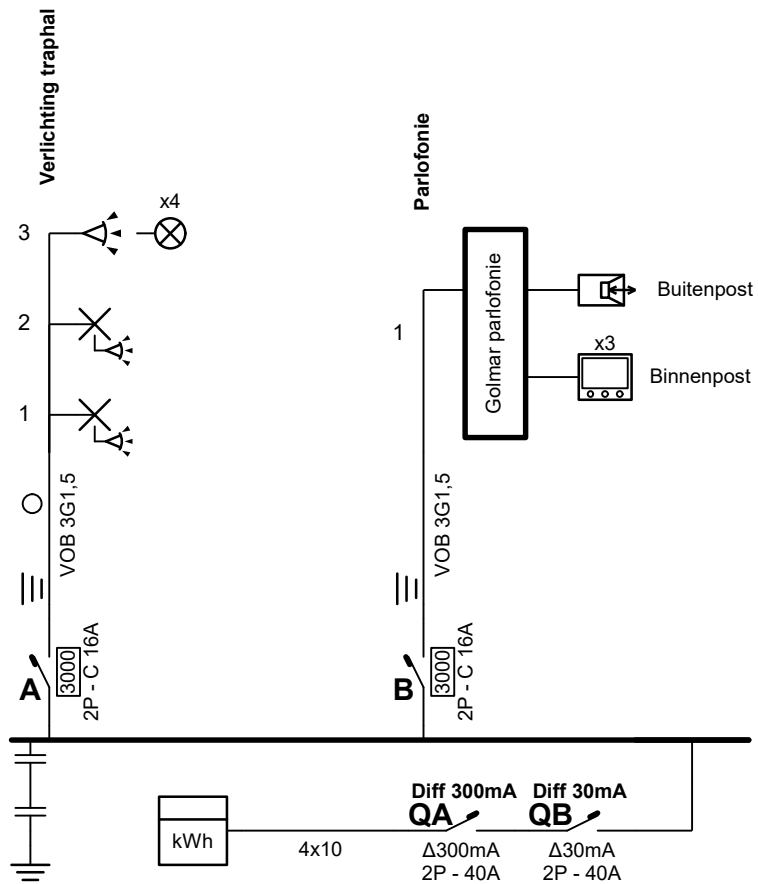

**Erkend Organisme**

ACEG  
Romeinsesteenweg 524 / 28b  
1853 Strombeek-Bever  
Tel.: 02 880 88 90  
e-mail: info@aceg.be




18/12/2023

**Plaats van de elektrische installatie**

Dhr. Charles De Cordier  
Fritz De Beulestraat 18 Bus AD  
9000 Gent

EAN 541448860022885191



**W WILLIAM VALENCYN**


NIEUWBOUW - VERBOUWING - HERSTELLING  
ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN

p. 1/3  
Eendraadschema


2 x 230V ~ 50Hz



GELIJKVLOERS

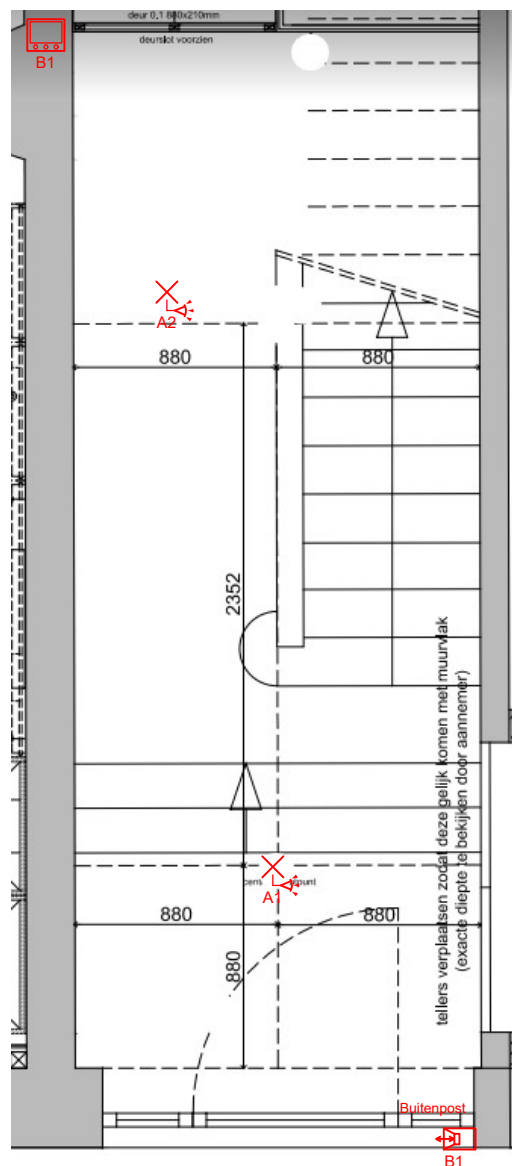

VERDIEP

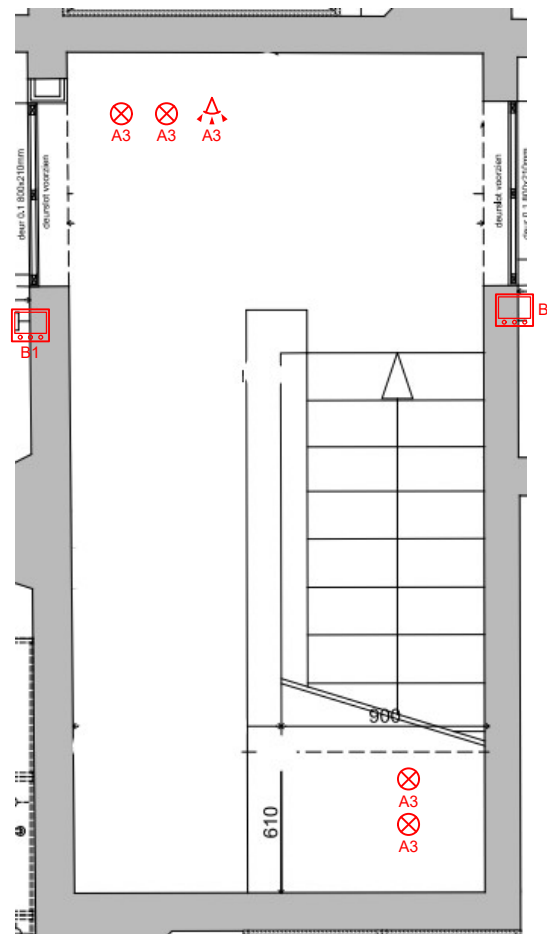

Erkend Organisme

ACEG  
Romeinsesteenweg 524 / 285  
1853 Strombeek-Bever  
Tel.: 02 880 88 90  
e-mail: info@aceg.be



326

Plaats van de elektrische installatie

Dhr. Charles De Cordier  
Fritz De Beulestraat 18 Bus AD  
9000 Gent

EAN 541448860022885191



**W WILLIAM  
VALENCYN**

NIEUWBOUW - VERBOUWING - HERSTELLING  
ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN

p. 2/3  
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

18/12/2023

Schema's getekend door: Afg. elektriciteitswerken William Valencyn BVBA - BTW BE 0684.700.927

**QA** Diff 300mA

**QB** Diff 30mA

**A** Verlichting traphal

**B** Parlofonie

**Erkend Organisme**

ACEG  
Romeinsesteenweg 524 / 28b  
1853 Strombeek-Bever  
Tel.: 02 880 88 90  
e-mail: info@aceg.be

**Plaats van de elektrische installatie**

Dhr. Charles De Cordier  
Fritz De Beulestraat 18 Bus AD  
9000 Gent

EAN 541448860022885191



**W WILLIAM  
VALENCYN**

NIEUWBOUW - VERBOUWING - HERSTELLING  
ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN

p. 3/3  
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz
