

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

Datum keuring: 26/09/2023

Inspecteur: Kevin Ganzeman

Mentor:

Installateur: Broma Building

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:BE 0635 516 284

Merk en type meettoestel: Metrel  
ET61557

Serienummer: 19481202

Datum verslag: 26/09/2023

#### Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Nekkersputstraat
Huisnummer	26
Busnummer	
Postcode	9000
Gemeente	Gent
Land	België

#### Eigenaar

Naam	Martens
Straatnaam	Nekkersputstraat
Huisnummer	26
Busnummer	
Postcode	9000
Gemeente	Gent
Land	België

#### Installateur

Naam	Broma Building
BTW nr.	BE 0635 516 284
Telefoonnummer	+32 499 87 12 13
E-mail	broma.afbouw@wp.pl

Type : algemene delen

EAN : 54

Teller Nr. : 1SAG1100408216

 Niet meegedeeld

Afbelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een niet huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1-9.1.1, 6.4. en 4.2.4.4.

Is de installatie aangevat voor  
01/06/2023?

Ja

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1-230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 7

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 35 MΩ

RE: 16,81 Ω

OK

OK



**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I <sub>t</sub>	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK

**BESCHRIJVING INSTALLATIE**

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
3	C	20		2	2,5
3	C	16		2	2,5
1	C	6		2	1,5

Visueel nazicht (algemeen) OK  
 Aansluitingen OK  
 Equipotentiale verbindingen OK  
 Continuïteit OK  
 Uitwendige invloeden OK

Directe aanraking OK  
 Indirecte aanraking OK  
 schema in bijlage door Aceg vzw NA  
 Doorsnede geleiders OK  
 Verlichting / toestellen OK

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

**BESLUIT**

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 26/9/2028
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Kevin Ganzeman

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.1.**

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

**Kwaliteit**

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

**Stappenplan voor een installatie die conform is:**

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 26/9/2028	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



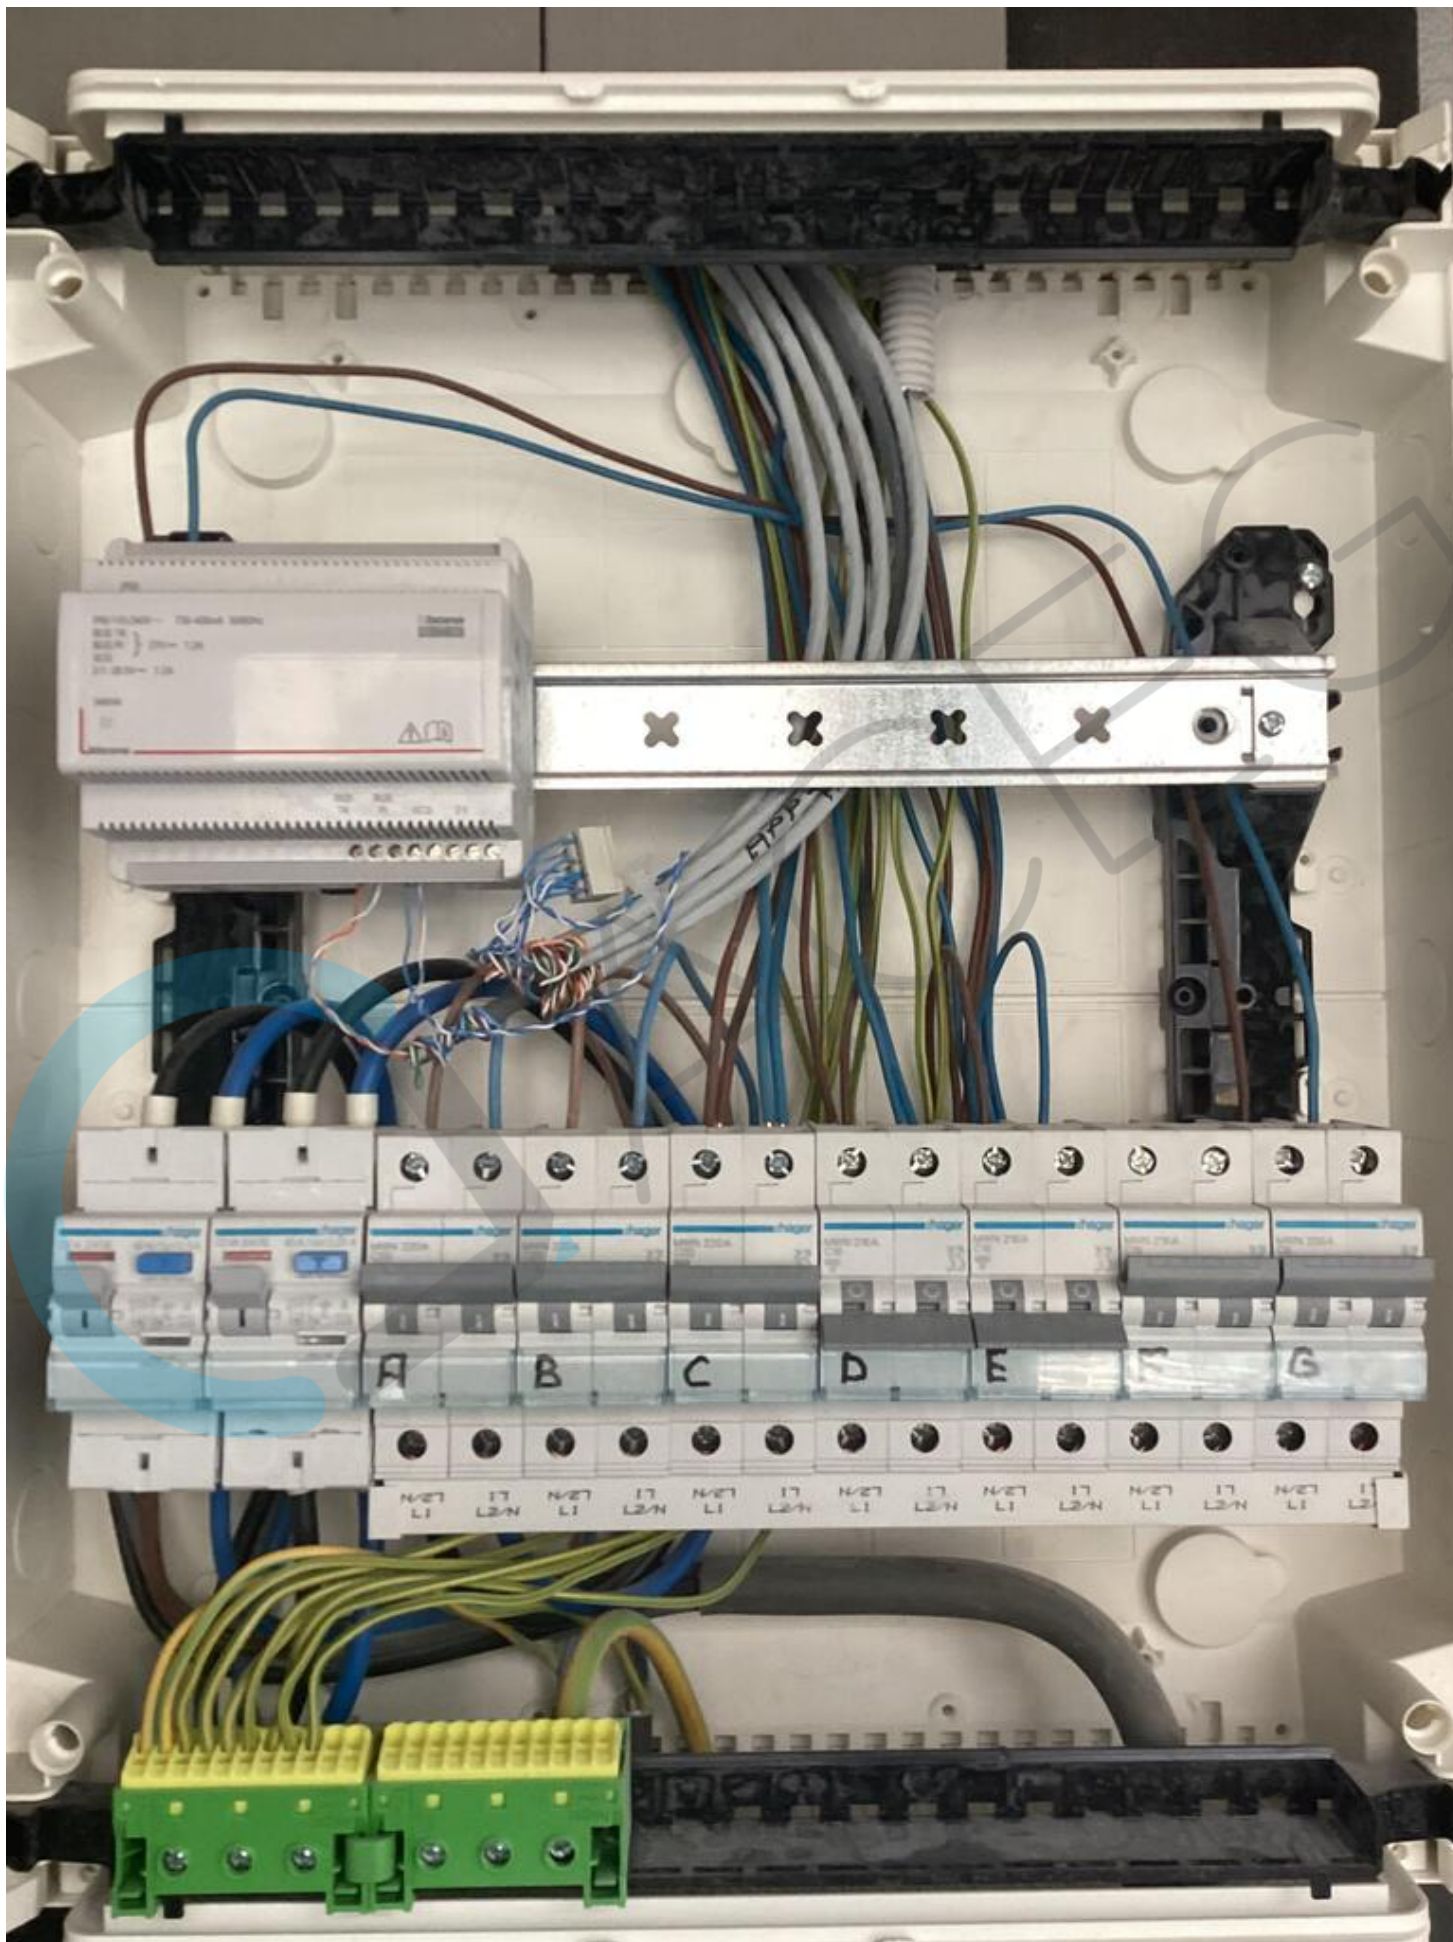



P. 1/2  
Eindnaamschema  
Datum: 18/09/2023  
2 x 230V - 50Hz

**Installateur**  
Broma Building  
Centrumstraat 124  
9000 Dieze  
Tel.: - GSM: 0499 87 12 13  
Fax: -  
e-mail: broma\_albouw@wp.pl

**Plaats van de elektrische installatie**  
Marions  
Nekkerputstraat Algemene vloen 26  
9000 Gent  
Tel.: - GSM: -  
Fax: -  
e-mail: -

**Erkend Organisme**  
ACEG  
Stationnel 71  
1600 Vilvoorde  
Rik: 02 680 88 80 GSM: -  
Fax: -  
e-mail: info@aceg.be

bema's getekend door: R.V.B

LITIMENDIGE INMIDDELEN GEMEENSCHAPPELIJKE GANG  
Gent Niekiltepuistraat 25 algemene dienst

AMCOW	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1


Geschiedt door: R.V.B

**QACEG**  
Rijksoverheid  
26/09/23

Plaats van de afzender: Instituut voor  
Chemie, Industrie, Agglomeratie Industrie  
Nieuwstraat 14/12  
9000 Gent  
Tel.: 09000  
Fax: 09000  
E-mail: [info@qaceg.be](mailto:info@qaceg.be)

Bestuurder:  
Erika Jullien  
Communicatie CO  
9000 Dender  
Tel.: 09000  
Fax: 09000  
E-mail: [erika.jullien@qaceg.be](mailto:erika.jullien@qaceg.be)

Scheepers' grafisch ontwerp: R.V.B

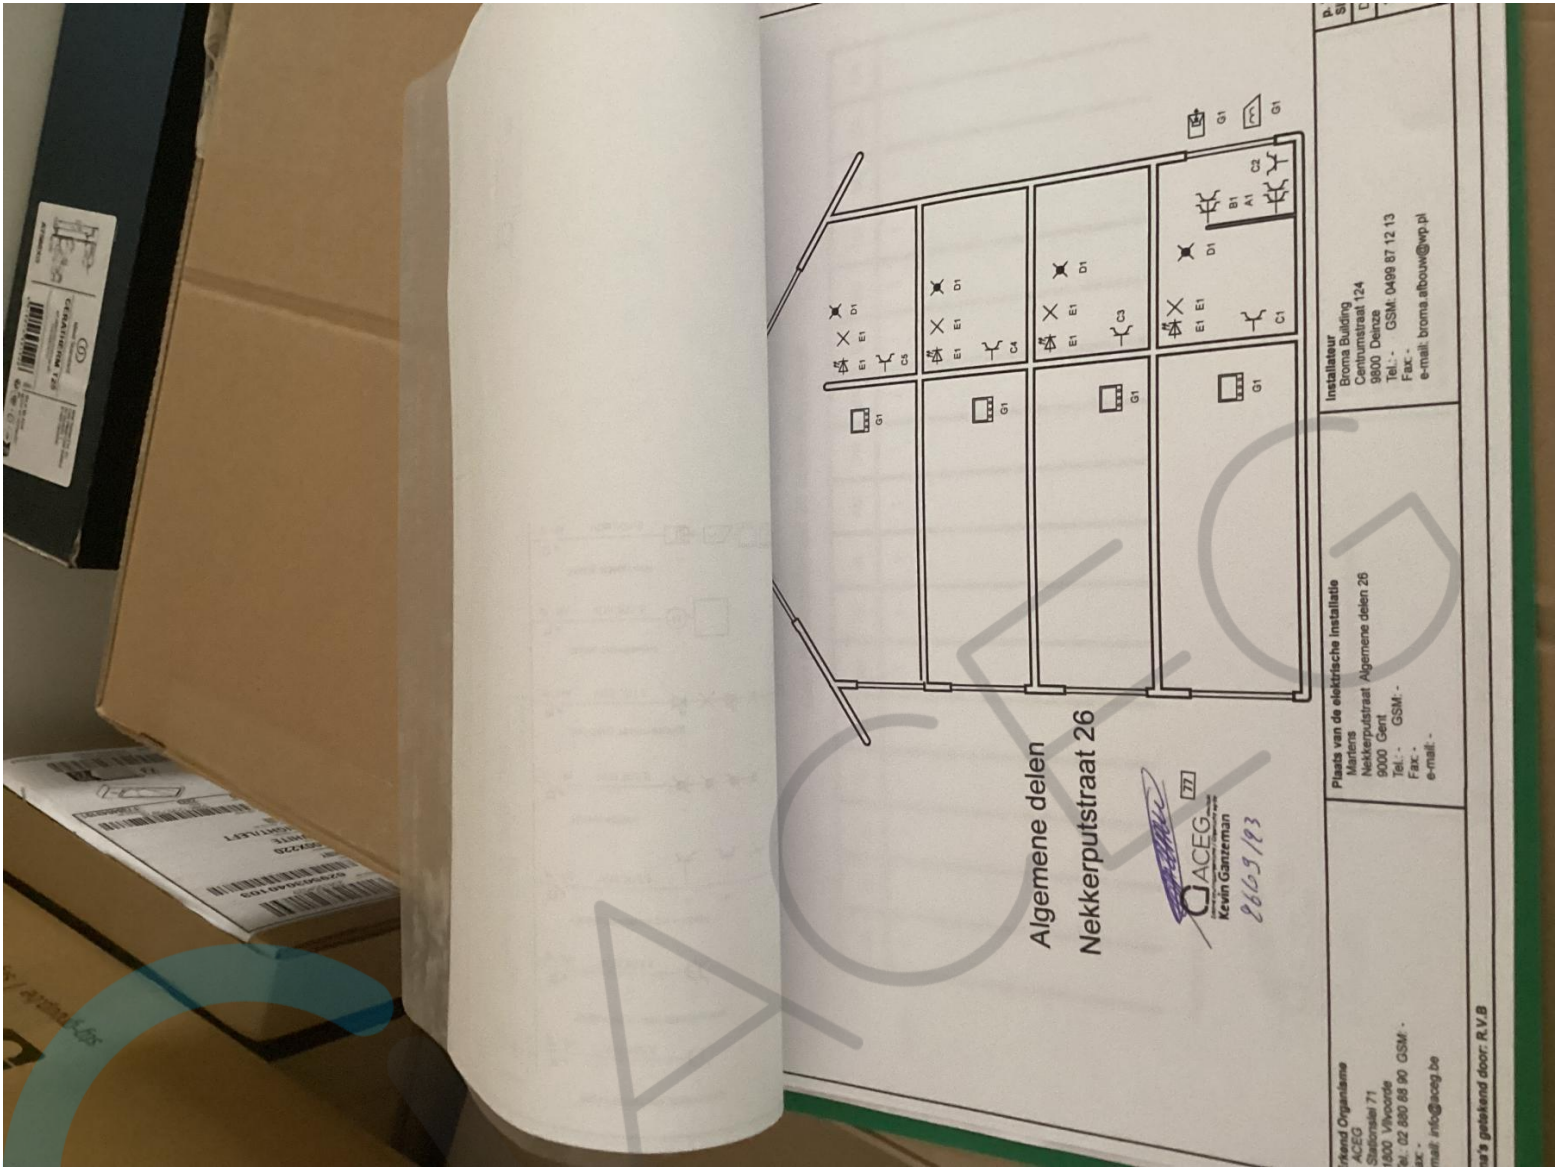

Algemene delen  
Nekkerputstraat 26

**ACEG**  
Kevin Ganzeman  
8663193

Verzend Organisme  
ACEG  
Kerkstraat 71  
3000 Herode  
Tel.: 02 880 88 90 GSM:  
E-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie  
Marians  
Nekkerputstraat  
9000 Gent  
Tel.: GSM:  
Fax:  
e-mail:

Installateur  
Broma Building  
Centrumstraat 124  
9800 Denze  
Tel.: GSM: 0499 87 12 13  
Fax:  
e-mail: broma.afbouw@wp.pl

ver's gestekend door: R.V.B





