



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P039210302/GE



N163667

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11

Brabant tel.: 02 674 57 11

Opst & West -Vlaanderen

Wallonië

tel.: 09 244 77 11

tel.: 081 432 611

Resi code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie: Proef-Allaach Tweebryggestr. 5 9000 Gent

Eigenaar of beheerder :

iden

Form with fields for Name, Address, ID card, and BTW number.

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Form with checkboxes for Art 270, 271, 276, Art 86-88, and Art 271 bis.

Algemene gegevens elektrische installatie :

Form with fields for EAN, kWh meter, protection, voltage, current, and description.

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Form with checkboxes for direct/indirect contact, insulation level, and sealing.

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Form with sections for Inbreuken Nieuwe installatie, Inbreuken Bestaande installatie, and Opmerkingen.

Besluit(en) :

Form with checkboxes for new/existing installation status.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

16-02-2036 (*)

door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam: SCHAUBLOECK Agent nr.: 3921 Datum: 16/02/2011

Bijlage(n) : Situatieschema(s) Eëndraadsschema(s)

Voor de directeur generaal Handtekening

Handwritten signature

- List of notes and disclaimers regarding the inspection process and safety.

DOSSIER

ELEKTRICITEIT

Januari/februari 2011

Opdrachtgever Dhr en mvr Proot Ignace en Allaert Lien
Tweebruggenstraat 5
9000 Gent

Uitvoerder ELQBO bvba
Trilkouter 34b
9940 Ertvelde



Kenny SCHAUBROECK
Inspecteur
3921

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.

16.01.2011

Duiding bij de uitvoering van de werken

In de kelder zijn alle leidingen in opbouw aangebracht. Grotendeels in kabelgoten, anderzijds d.m.v. PVC leidingen met beugels verbonden met de muur.

Er is gebruik gemaakt van prefex leidingen en xvb bekabeling waar mogelijk.

XVB bekabeling die zich in de muur bevindt is beschermd door een stuk preflex.

Voor het gelijkvloers zijn alle leidingen aangebracht via de kelder en verder vertikaal in de muur geplaatst.

Voor de verdiepingen zijn de leidingen doorgetrokken onder de plankenvloer.

Voor de zolder is gebruik gemaakt van opbouw materiaal. Momenteel enkel noodzakelijk voor het brengen van licht in twee ruimtes.

Overal is voor circuits met stopcontacten gebruik gemaakt van bedrading 2,5 mm². Deels d.m.v. preflex buizen, deels d.m.v. xvb bekabeling.

Overal is voor circuits met verlichting gebruik gemaakt van bedrading 1.5 mm². Op onderstaande uitzonderingen na :

Licht in bibliotheek maakt deel uit van een gemengd circuit. De bedrading voor de verlichting is hier uitgevoerd met 2,5 mm²

Licht in de slaapkamers op tweede verdieping maken beiden deel uit van gemengde circuits. Hier is de bedrading met 2,5 mm² uitgevoerd

Er is een voorziening gemaakt om vloerstopcontacten te plaatsen in de leefruimte en in het bureel.

Deze voorziening wordt pas later in dienst genomen. Voorlopig zijn de kabels afgeschermd en weggeborgen.

In de kelder zijn alle lichtpunten teruggebracht naar de automatenkast (bord 1) om een indicatieled te laten werken in de gang ter hoogte van het trapbegin naar de kelder toe.

Hiervoor zijn 6 contactoren in de automatenkast opgenomen. Dit is niet opgenomen in het eendraadschema.

Het buitenstopcontact op de muur van de wijnkelder (F6) is nog niet geplaatst. Dit wordt later geplaatst.

Deze kabel, samen met de kabels voor tuinverlichting en tuinstopcontacten liggen opgeborgen in de wijnkelder.




Kenny SCHAUBROECK
Inspecteur
3921

[Handwritten signature]

i.o.
EZDBO buke.

EENDRAADSSCHEMA TWEERUIGGEN STRAAT NR 5

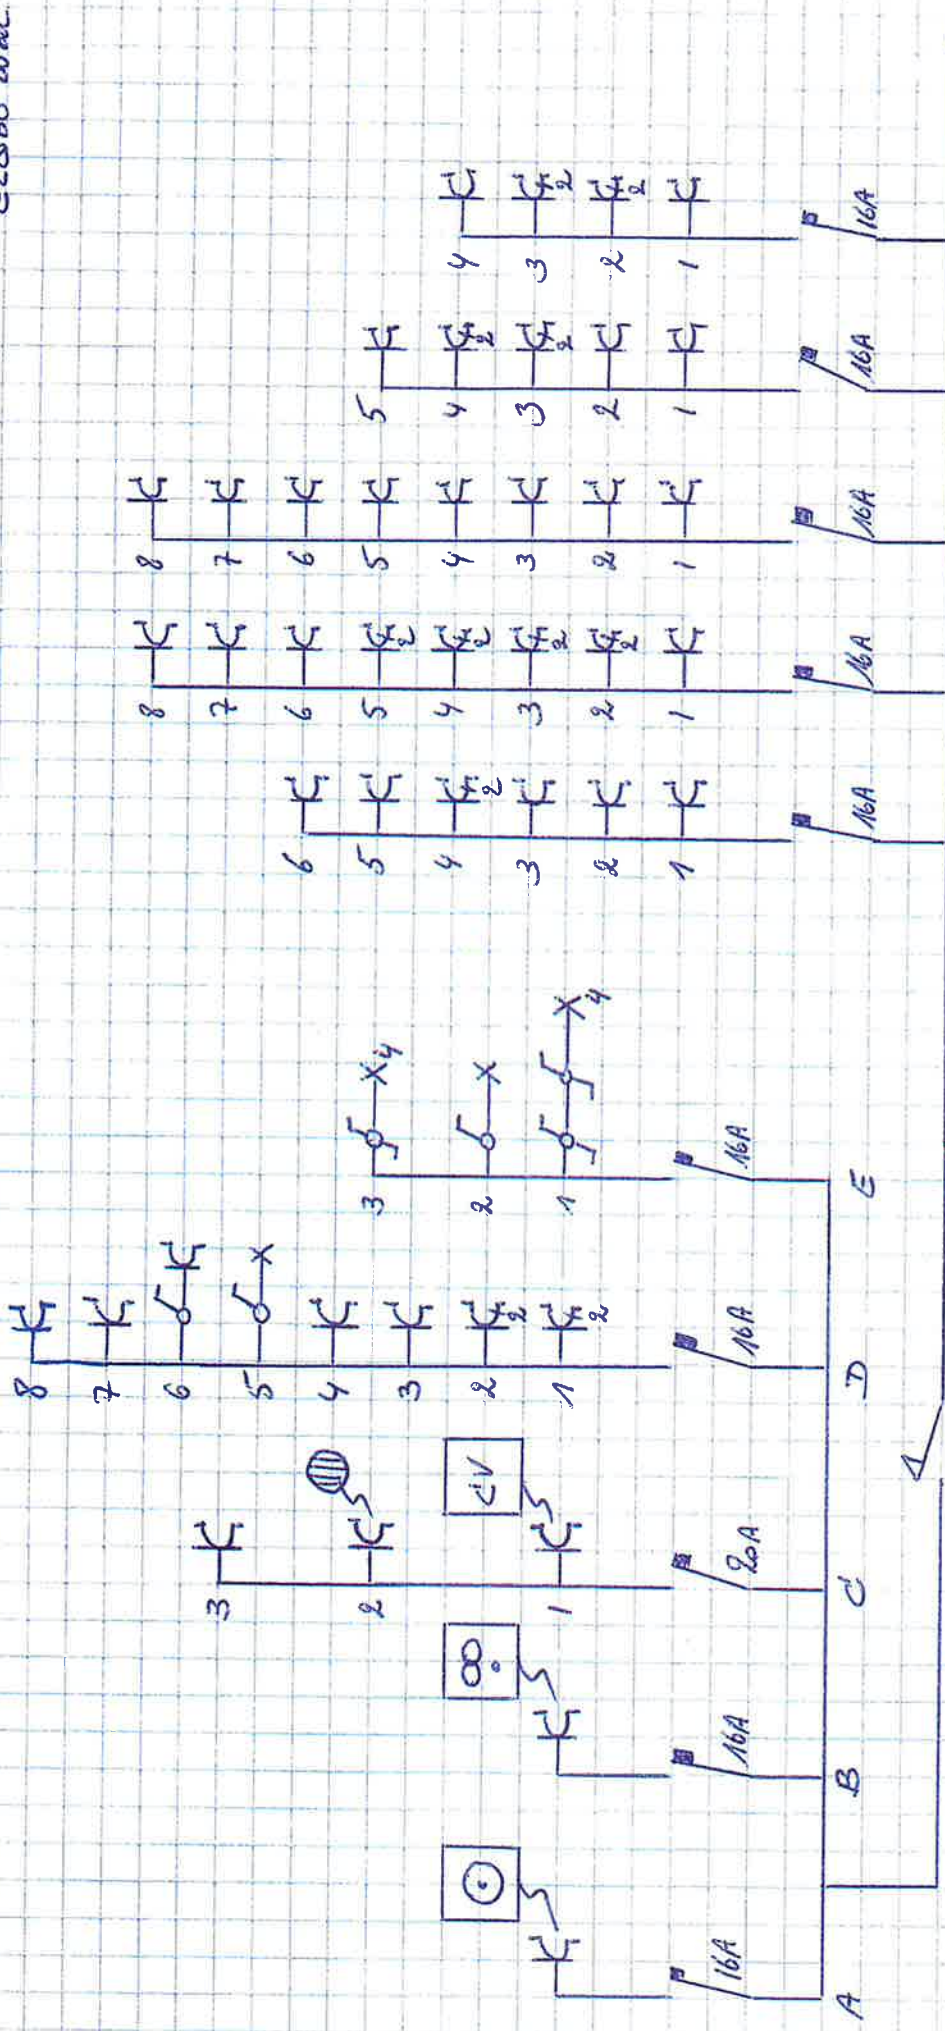

B
BLAD 1/9



Δ 30/40A
Δ 300/40A



Verantwoordelijke voor de uitvoering van de werken

Charles Van Hout i.o.


ELO BO bvb



Verantwoordelijke voor het erkennen teknoorganisatie

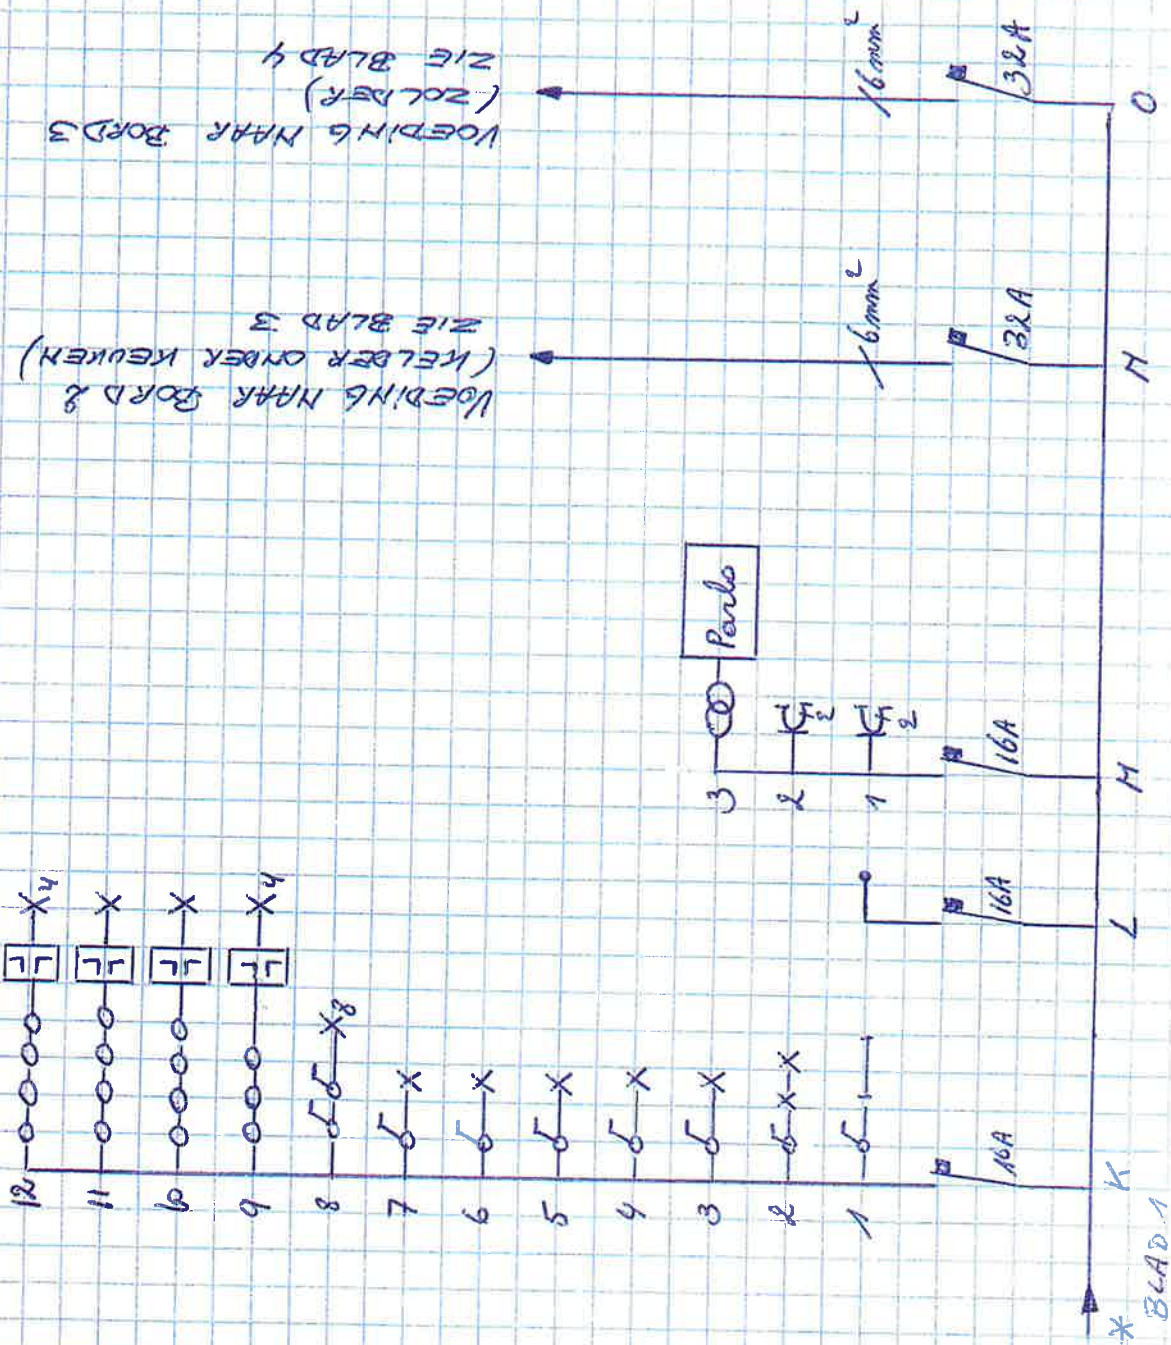



Handwritten signature
 G.O. ELAAS

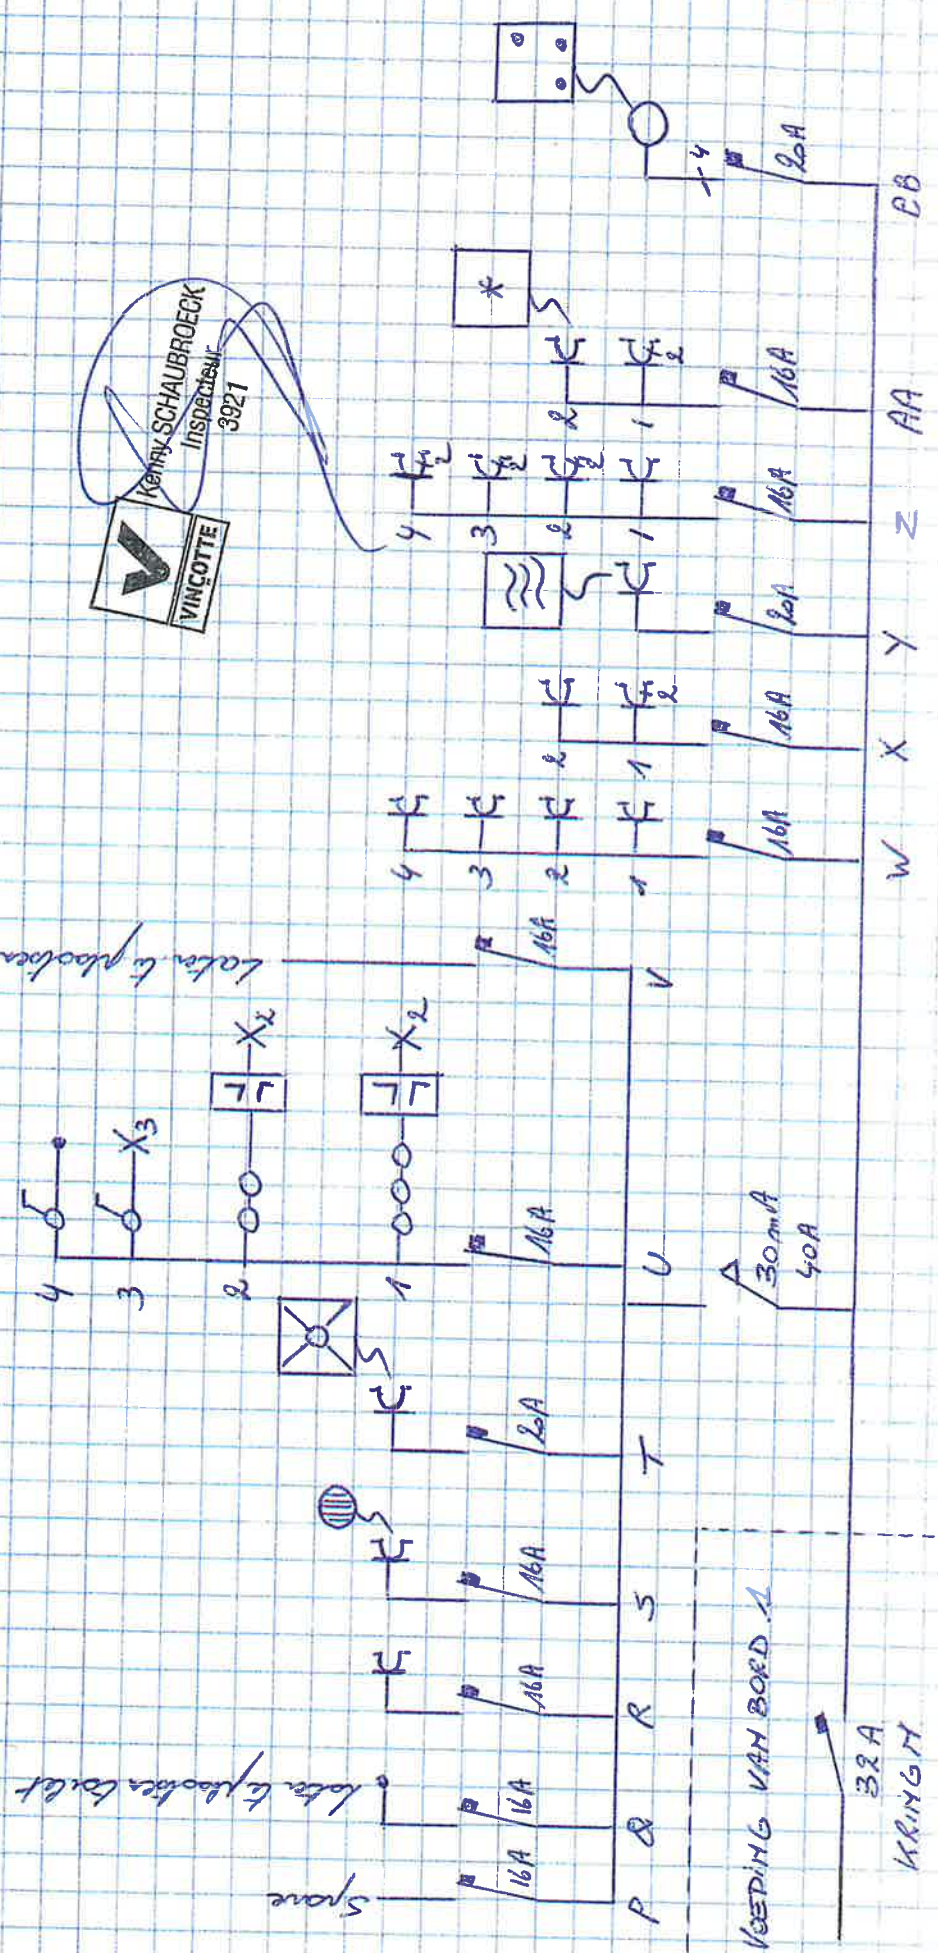

[Handwritten signature]

C.O. EDABO

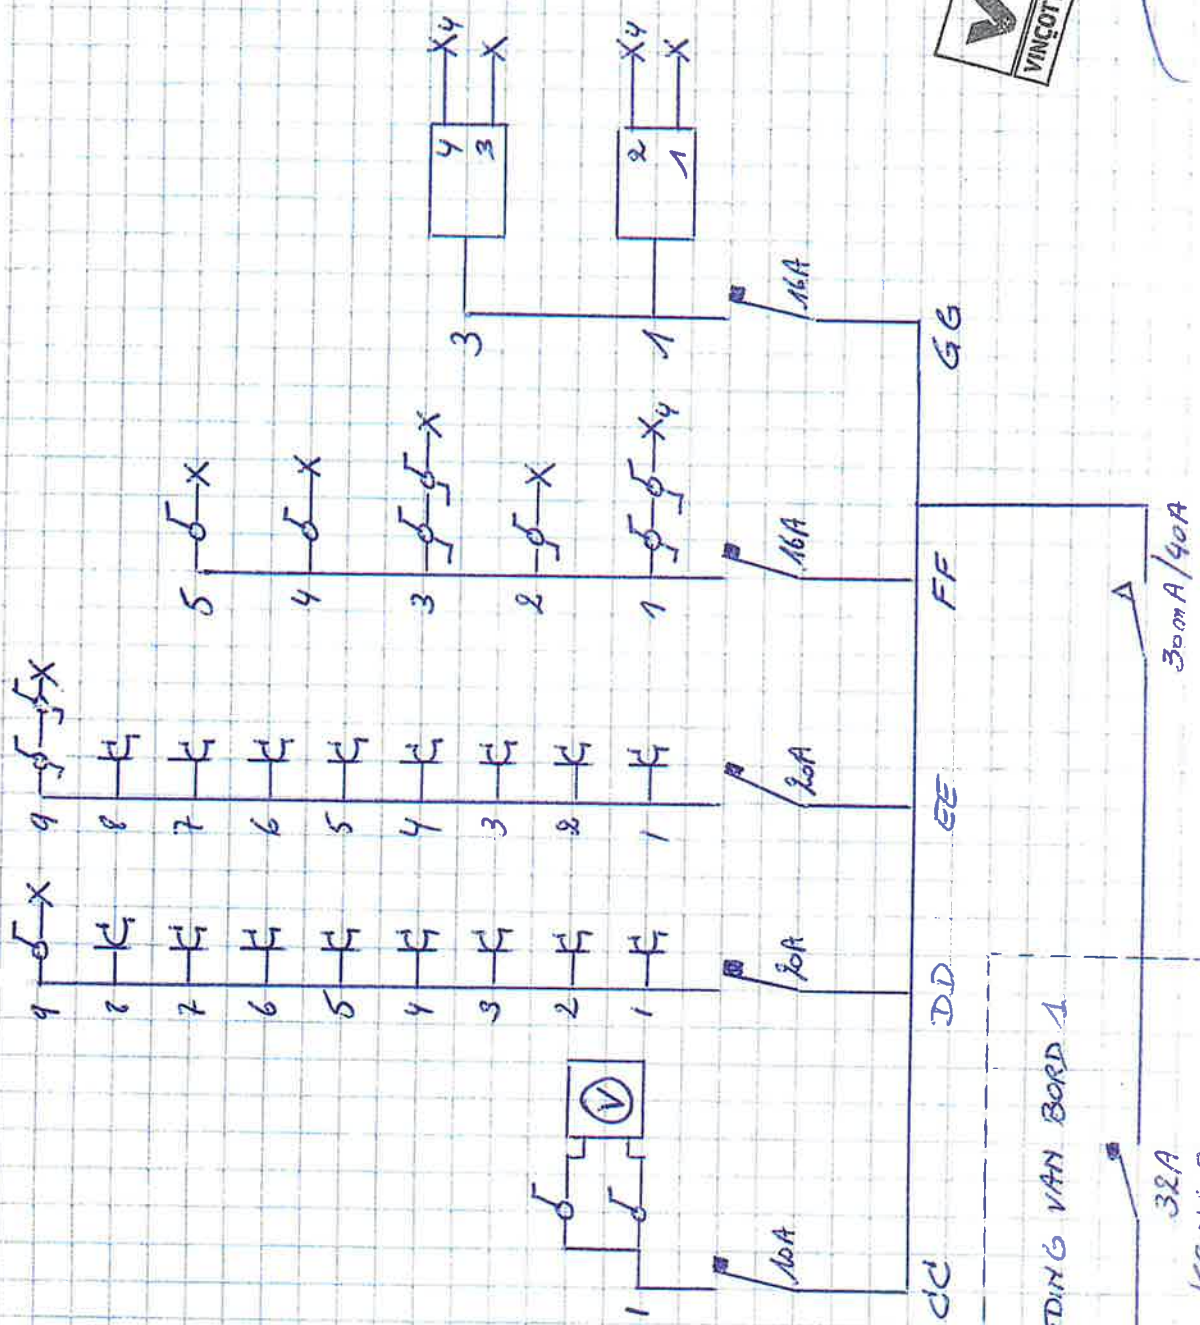

Bureel

Lichtgrijze UTP kabel
Witte UTP kabel

UTP AK
UTP AK

Telefoon RJ11
UTP RJ45

RJ 11 Telefoon	RJ 45 PC
-------------------	-------------

RJ 11

1	/
2	Wit/bruin
3	Wit/blauw
4	Blauw
5	Bruin
6	/

Voorplaats en achterplaats gelijkvloers

Druktoetsen verlichting deuren naar inkomhal Buis I en K

Centraal licht voorplaats	Centraal licht achterplaats
bruin	grijs
Spotjes voorplaats	Spotjes achterplaats
Zwart/rood	Zwart/wit

Druktoetsen verlichting deur naar keuken

Centraal licht voorplaats	Centraal licht achterplaats
bruin	grijs
TL armaturen bovenkasten in keuken	Spotjes achterplaats
	Zwart/wit

Bewegingsmelders in inkomhal. Beiden staan parallel

Blauw	Neuter van kast naar bewegingsmelder
Bruin	Fase van kast naar bewegingsmelder
Zwart	Fase naar de lichtpunten inkomhal

1e Verdieping

Aansluiting bewegingsmelder 1e verdieping

Blauw Voeding N
Bruin Voeding F
Zwart Terugkerende F na schakelkontakt

Aansluiting beller en zoemer in plafond achter spotje kant badkamer/slaapkamer

Titino sfera : externe bel Blauw / Bruin

Titino sfera : externe bel Grijs / zwart

Schakelaar ventilator in badkamer 1

Blauw / Bruin is gebruikt.

Grijs, zwart en geelgroen : niet gebruikt

BORD 1 KELDER

KRING A Wasmachine Buis A 16A	KRING B Droogkast Buis B 16	KRING C CV ketel Boiler WATERVERZ. Buis D 20A	KRING D Stopc'n 1e verdiep badkamer Buis 12 16A		Indicatie lamp (blauw)	Indicatie lamp (blauw)	Melders inkom	Melders inkom	Melders inkom	Fase naar drukknoppen	Teleruptor centraal voorpl	Teleruptor centraal achterpl	Teleruptor spots voorpl	Teleruptor spots achterpl
--	--------------------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------

br gr zw/ro zw/wt

KRING E Licht 1e verdiep Buis 13/14/15 16A	KRING F Stopcontactn kelder kant nr 7 Buis C 16A	KRING G Vloerstopc + Stopc'n gelijkvloers kant nr 7 Buis G en H 16A	KRING H Stopc'n gelijkvloers midden Buis F 16A	KRING I Stopc'n 1e verdiep voorplaats Buis 10 16A	KRING J Stopc'n 1e verdiep achterplaats Buis 11 16A	KRING K Voeding verlichting Kelder Inkom gelijkvl. 16A	KRING L Voeding Alarm 16A	KRING M Voeding parlofoon en modem 16A
---	---	---	--	---	---	---	---------------------------------	--

HOOFDDIFFERENTIEEL 40A / 300 mA	DIFFERENTIEEL 40 A / 30mA	KRING N Voeding BORD 2 32A	KRING O Voeding BORD 3 32A
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

KR 1 KABEL 4	KR 2 KABEL 3	KR 3 kabel 6	KR 4 kabel 6	KR 5 Kabel 1	KR 6 Kabel 7		Voeding parlofooninstallatie
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	------------------------------

Volgende kabels zijn niet aangesloten maar opgerold in onderkant van de kast

Kabel 6 naar zolder Old 1 Old 2	Voor bediening armatuur achter glasplaat op zolder Oude voedingskabel, vroeger naar bord bibliotheek Oude kabel naar zolder, was voor :
---------------------------------------	---

BORD 2 IN KELDER ONDER DE KEUKEN

	Voeding schakelaars our
	Naar licht tuin
	Naar licht tuin
	Lampen terras
	Lampen terras
	Teleruptor TL's boven kast
	Terl's spotjes onder kast

KRING P	Spare	16A
KRING Q	Later te plaatsen toilet	16A
KRING R	Dompelpomp	Buis 9 16A
KRING S	Boiler onder trap	Buis 10 16A
KRING T	Vaatwas	Buis 9 20A
KRING U	Verlichting Keuken Terras, tuin	Buis L 16A
KRING V	Voeding Stopc'n Tuin	Buis 8 16A
	Verliesstroom schakelaar 30 mA	

KRING W	Stopk'n kelder midden 4 st	Buis E 16A
KRING X	Vrij stopc en dampkap	Buis W 16A
KRING Y	Combi-oven	buis Z 20A
KRING Z	Vrije stopc.	Buis T 16A
KRING AA	Vrij stopc en koelkast	buis V 16A
KRING BB	Kookplaat	Buis X 20A

BORD 3 ZOLDER


	KRING CC	KRING DD	KRING EE	KRING FF	KRING GG	
	buis 3 STOPC	buis 4 STOPC	buis 5 LICHT	Licht 1e verdieping via RF's		
	AFZUIGING BADK's	Badk, gang één in ruimte naar zolder	Voorpl en achterplaats 2e verdiep	Badkamer 2e verdiep		
	10A	20A	20A	16A	16A	
	Kiem ventilo					

Verliesstroom automaat 30 mA / 40A	RF ontvanger 1
	RF ontvanger 2


- KRING CC Afzuiging badkamer 1e en 2e verdieping
- KRING DD Stopkontakten en verlichting achterste kamer tweede verdieping. Niet kant nr 7
Stopkontakten in kamer met trap naar zolder
Stopkontakten badkamer en gang
- KRING EE Stopkontakten en verlichting voorste kamer tweede verdieping.
Stopkontakten achterste kamer kant nr 7
- KRING FF Licht badkamer, traphal tweede verdieping en kamer met trap naar zolder
Verlichting zolder
- KRING GG Verlichting voorplaats en achterplaats 1e verdieping d.m.v. RF sturing

AANSLUITING VAN DE GEBRUIKTE LEIDINGEN OP DE COLLECTOREN


Collector koud water onder de keuken

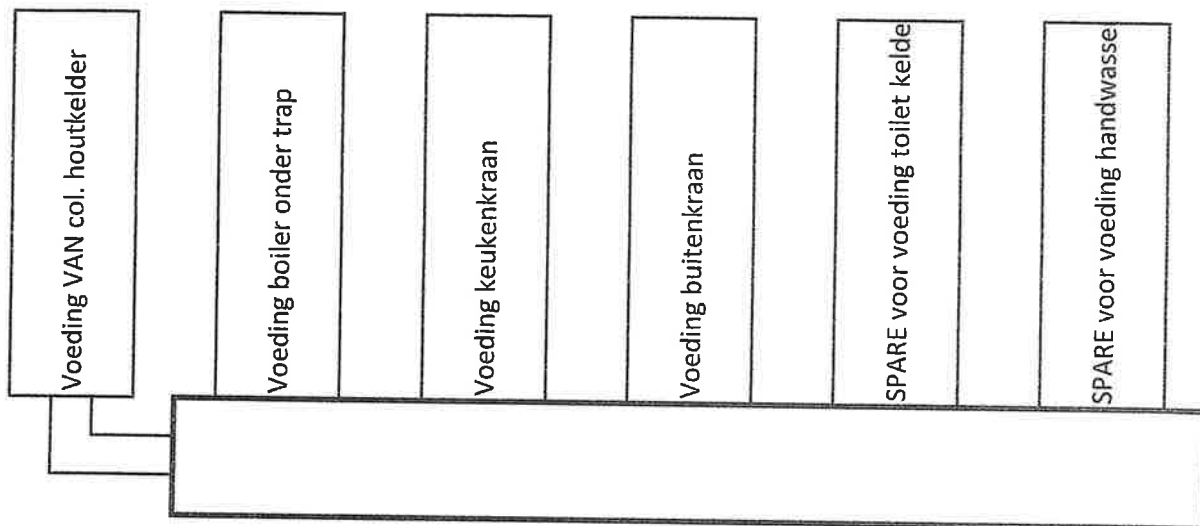


Hoofd collector koud water aan boiler houtkelder

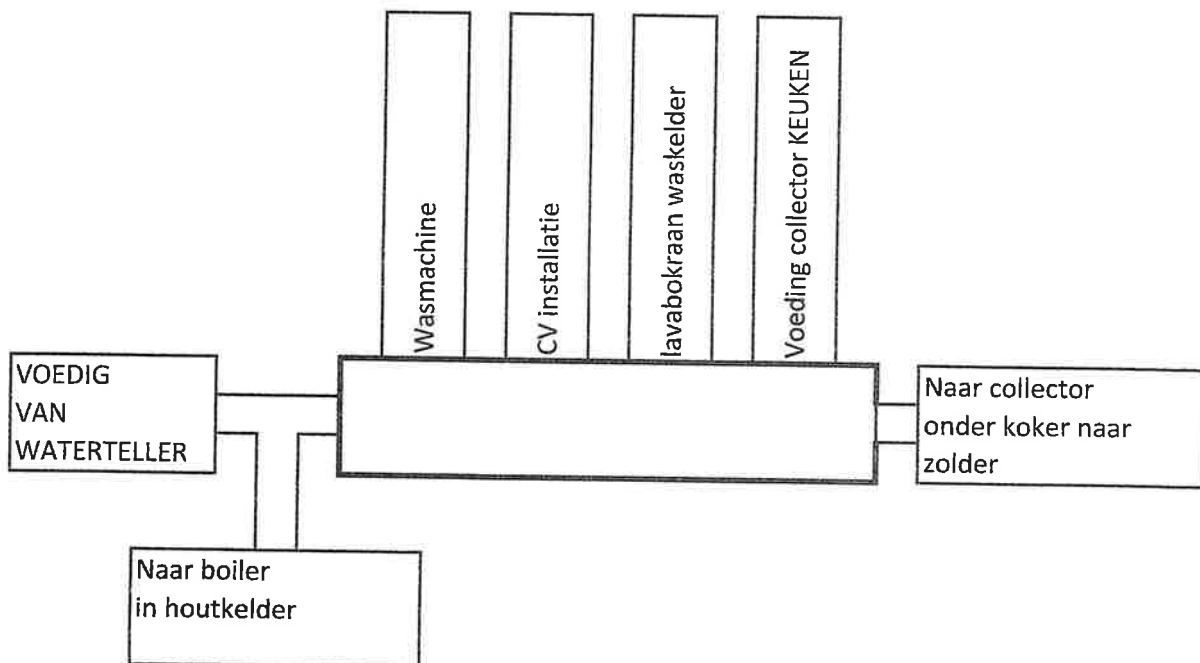

Collector koud water onder koker naar zolder in houtkelder

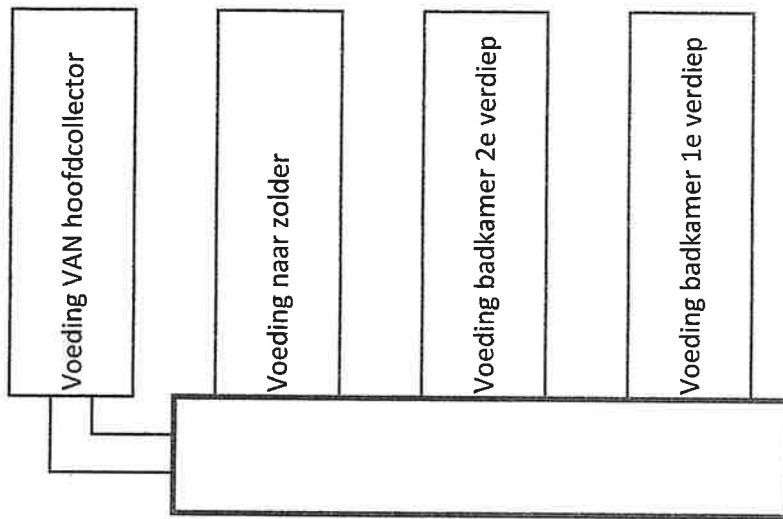

Collector warm water onder koker naar zolder in houtkelder

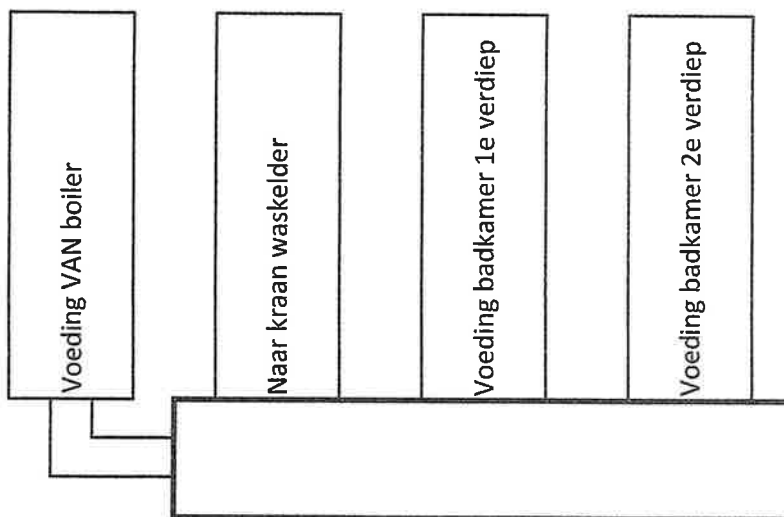


SITUATIE 2^e VERDIEPING




Kenny SCHAUBROECK
Inspecteur
3921

[Handwritten signature]

BLAD 8/10

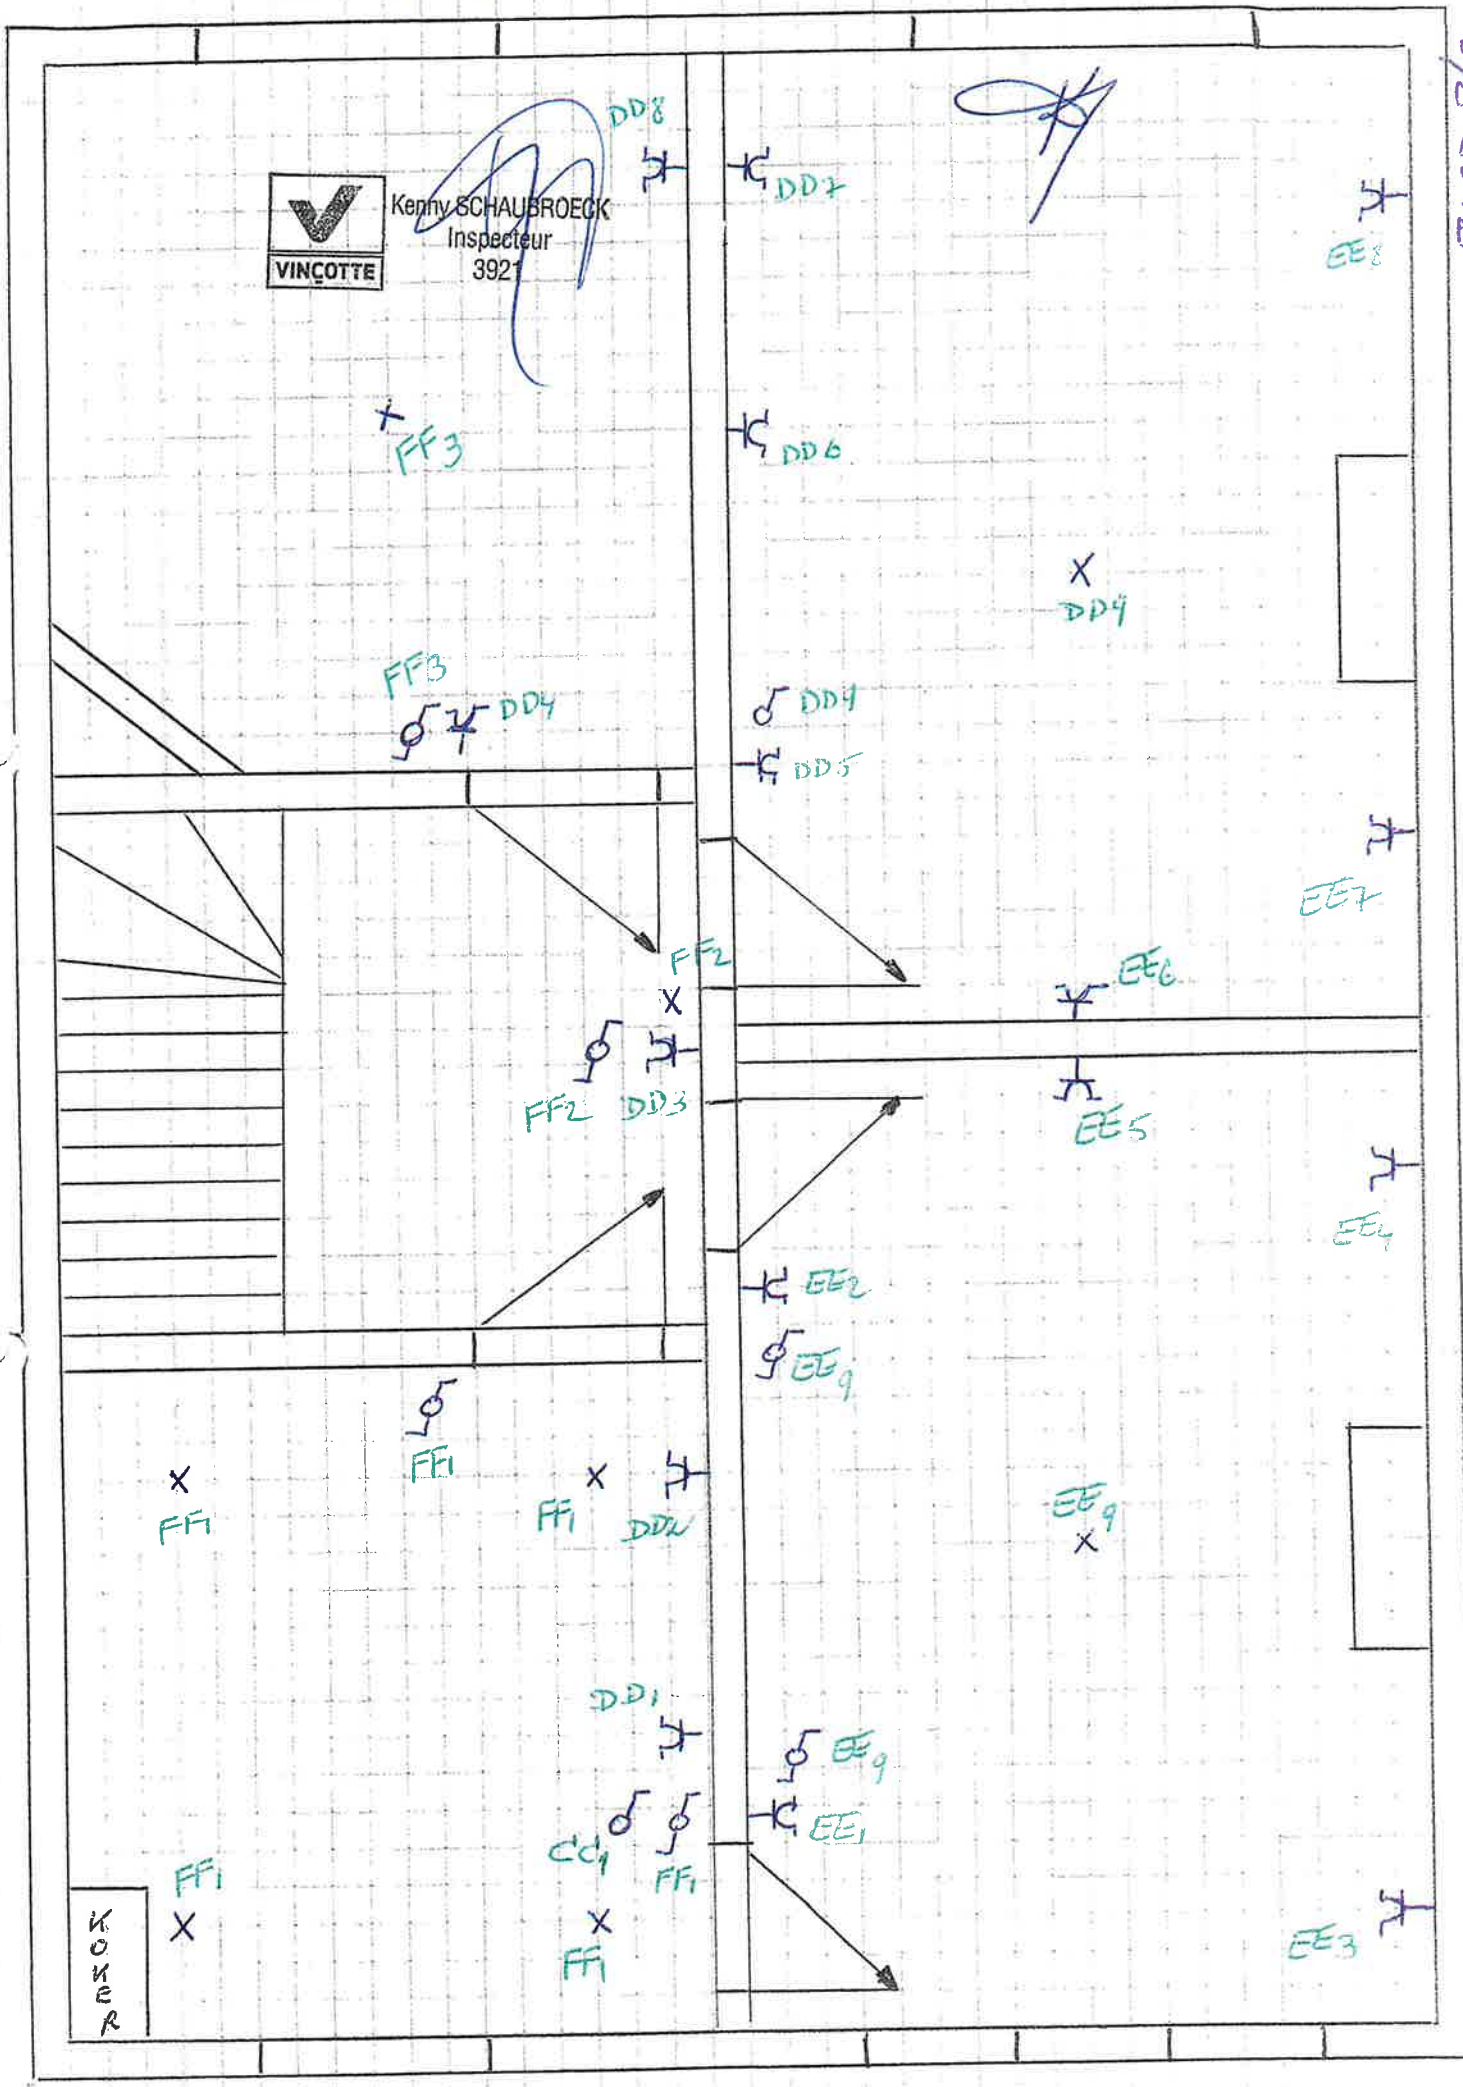

SITUATIE 1^e VERDIEP

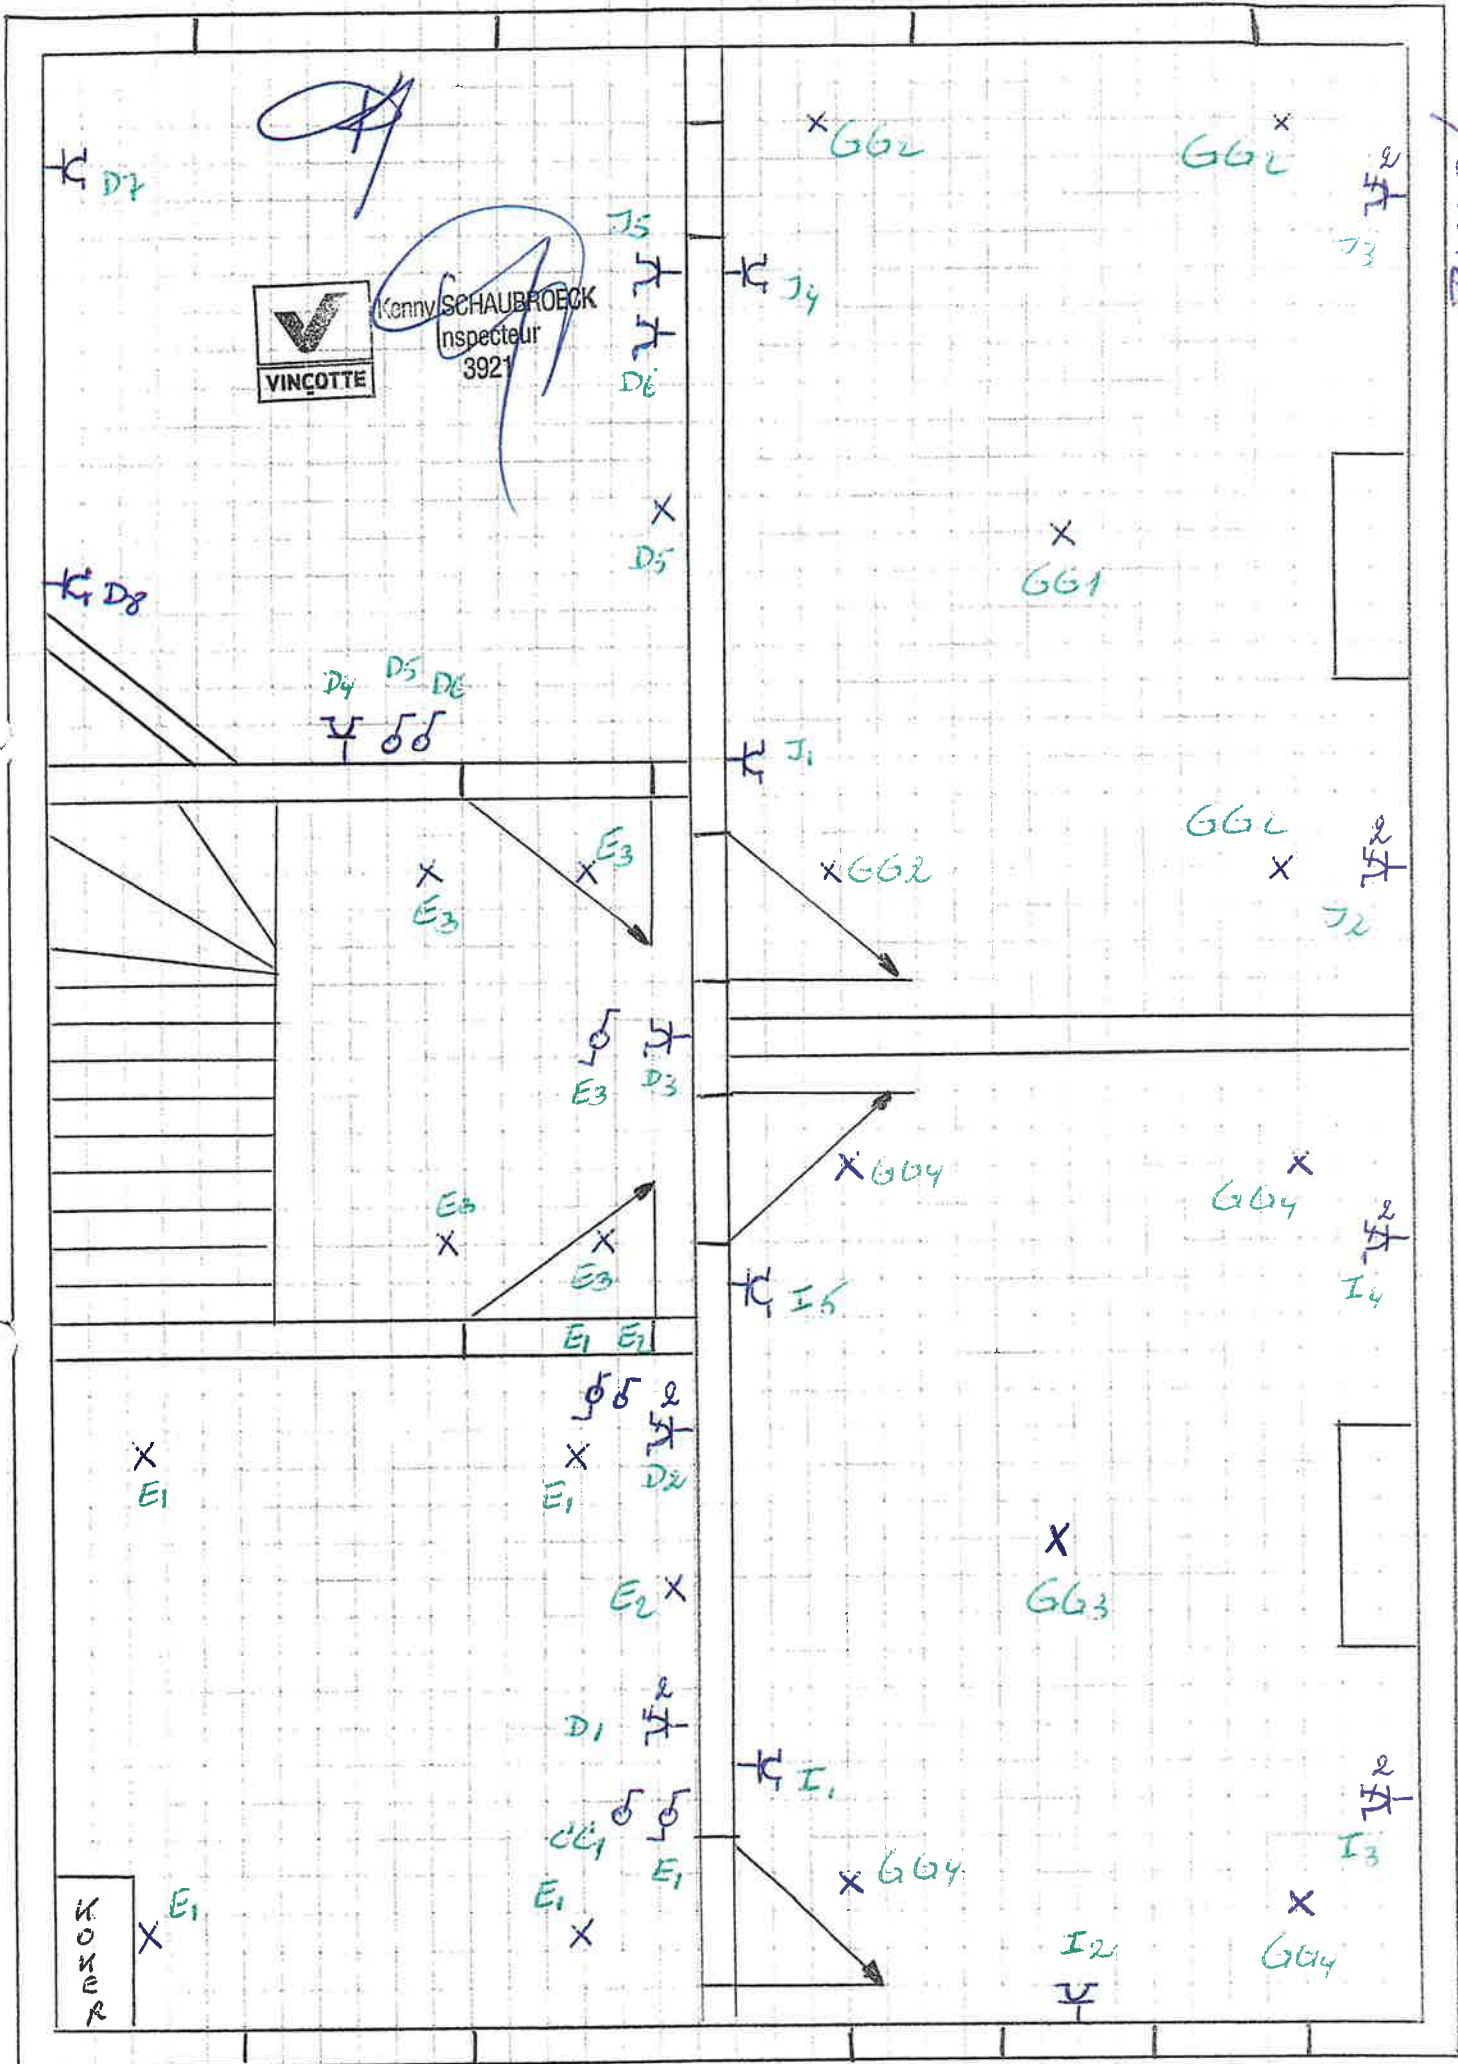

Kennv. SCHAUBROECK
Inspecteur
3921

BIANZI

KOOPER

GELUKVLOERS

[Handwritten signature]

U4



Kenny SCHAUBROECK
Inspecteur
3921

BLAD 6/9

X U3

X U3

X U3

X U4

TE2 XI 05 00
U3 U4 U1 U4

X X2

TE1 AA1

X T

X U1

X U2

X AA2

X Y

Z4 Z3 Z2 Z1
U1 U2 U0

X K9

H8 K10 K11
K9 K10

X K9

X K10

X K8 X K8

H7 K10 K12
K11 K12
X K9

X K9

Kelde 1e

X H6

X H5

X K8 X K8

X H4 X K12

X K12

X K11

X K8

X K8

K10 K12
K11 K12
X K12

X K12

X K8

X H1

X G1


SITUATIE KELLER

[Handwritten signature]




Kenny SCHAUBROECK
Inspecteur
3921

BLAD 5/0

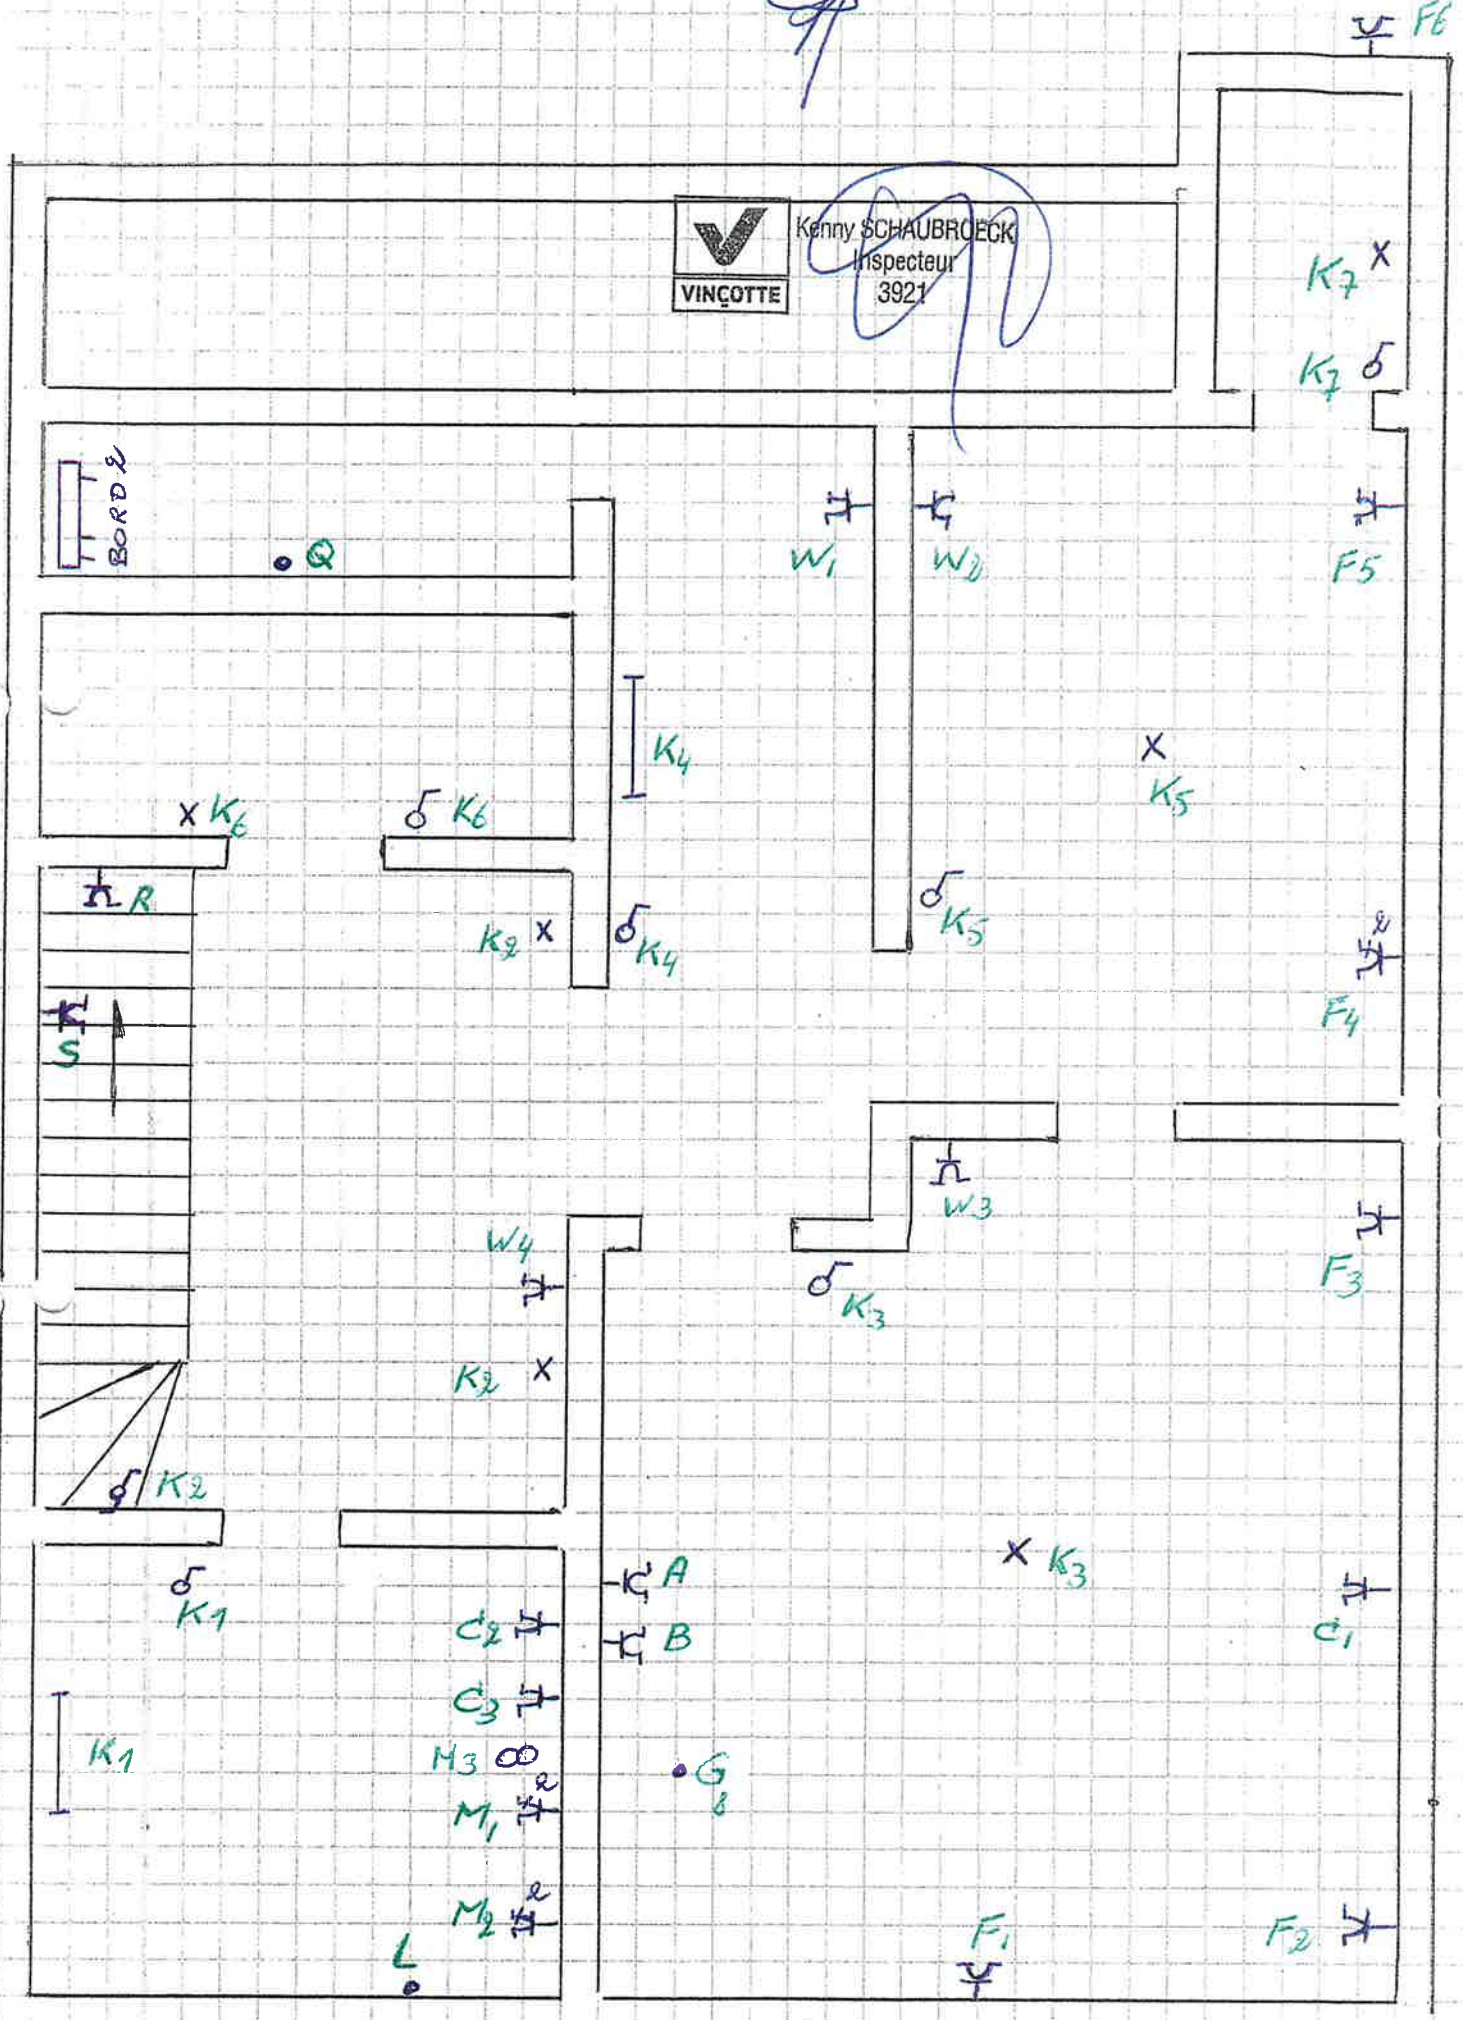

SITUATIE ZOLDER



X
FF4

FF3 FF4
FF3

X
FF3



Kenny SCHAUBROECK
Inspecteur
3921



0cc1
