



**J. VAN HEMELEN**  
KEURINGSORGANISME VZW

Aanvraagnr. 228749 Ref. verslag RAP PA 2017/ 04 04 1F

**Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG  
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK  
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org  
BTW BE 0422.507.353

- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaren van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

<b>Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam</b>	KOUTER KD	Voornaam		Postnr	
---	-----------	----------	--	--------	--

<b>Adres</b>		Gemeente	
--------------	--	----------	--

<b>Installateur</b>	ELEKTRIEK nv	Gemeente	DIKSMUIDE
---------------------	--------------	----------	-----------

<b>BTW-nummer</b>	BE 0444242578		
-------------------	---------------	--	--

of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente	
------------------------	---	------------------	-----------	----------	--

<b>Plaats van onderzoek</b>		Post.	9000
-----------------------------	--	-------	------

<b>Adres</b>	KOUTERDREEF 31/201	Gemeente	GENT
--------------	--------------------	----------	------

<b>EAN-code</b>	541448860014780183	Elektriciteitsverdelers	
-----------------	--------------------	-------------------------	--

<b>Type installatie</b>	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten	<input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere)	<input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheden	<input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid
-------------------------	--	---	--	--

**Algemene beschrijving van de aansluiting**      **Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen**

U <sub>nom</sub> (V ac/dc)	1N 400V	2x2P AUT 16A/C	-1.5mm <sup>2</sup> -
Ø voedingskabel (mm <sup>2</sup> )	4x10mm <sup>2</sup>	6x2P AUT 20A/C	-2.5mm <sup>2</sup> -
I <sub>nom</sub> aansluiting (A)	40A	1x2P AUT 32A/C	-6mm <sup>2</sup> -
Type alg. schakelaar	DIF		
Aantal borden	1	VIA 30mA	
Aantal eindstroombanen	14	4 x2P AUT 20A/C	- 2.5mm <sup>2</sup> -
Type aardelektrode	LUS	1 x2P AUT 16A/C	-1.5mm <sup>2</sup> -
Algemene diff.stroom.inr.	40/0.3/2P		
Bijkomende diff.stroom.inr.	40/0.03/2P		

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

**Metingen**      Meetapparaat :      apparaat waarvan de inspecteur titularis is      **Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig :**      procedure TD-E-01

Aardspreidingsweerstand :	2.51	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	>1	Werkingsdifferentieelstroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot. :	OK
---------------------------	------	------------------------------------	----	---	----------	--	----

**Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)**

	GEEN
	VERLICHTING
	KEUKEN
	MEUBILAIR -SANITAIR
	ELEKTRISCHE TOESTELLEN
	<input type="checkbox"/> Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP - - - / - - - - -


**Besluit**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd.  
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)  
De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.  
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór

<b>Volgend controlebezoek uiterlijk op:</b>	04/04/2042	<b>Agent-onderzoeker (naam - nr. handtekening)</b>		<b>Datum onderzoek:</b>	04/04/2017
---	------------	--	--	-------------------------	------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

RAP-E-901 (01.07.2008)

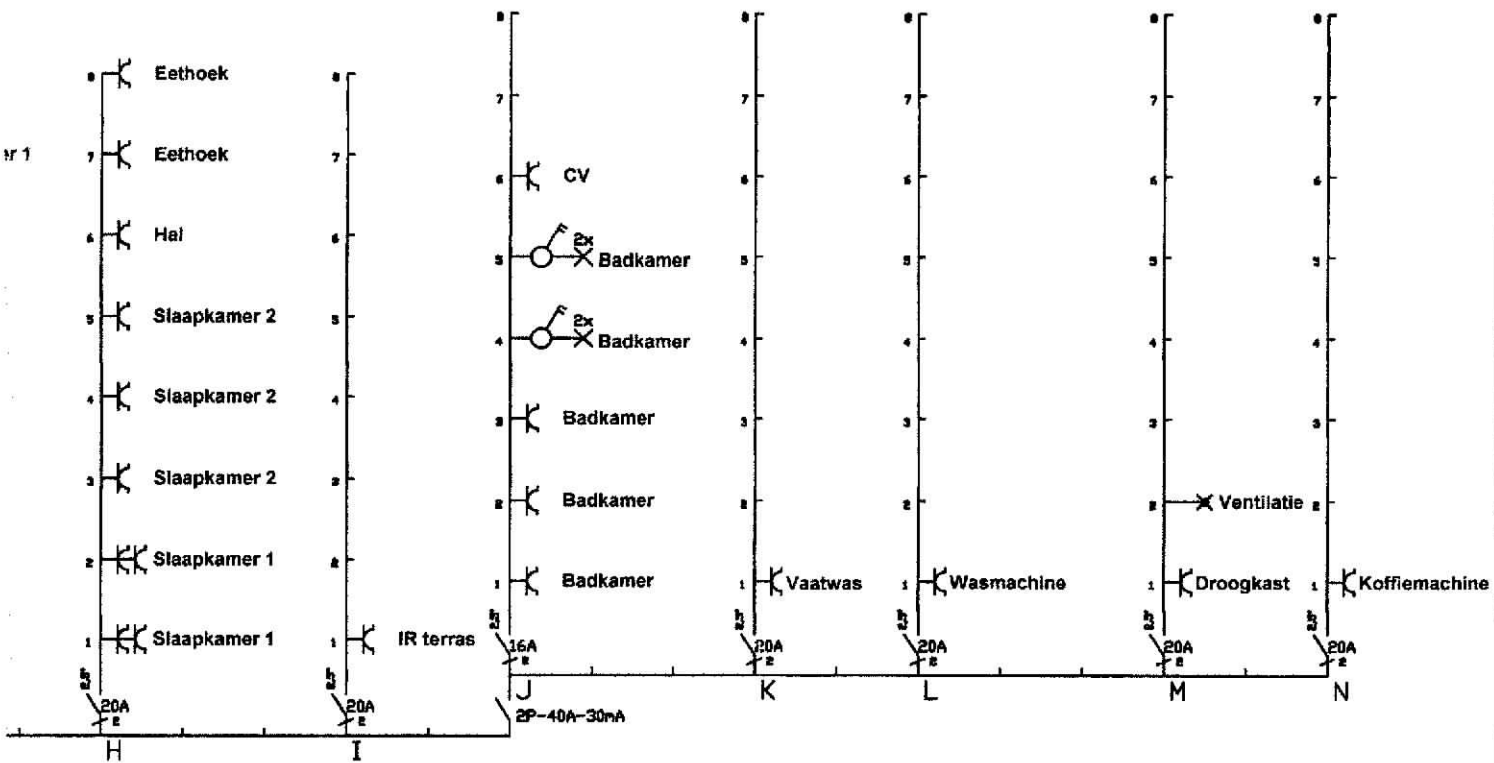

*order zelf*

**VH J. VAN HEMELLEN**  
 KEURINGSORGANISME VZW  
 inspecteur (117)  
 ARNOE Piet

EAN NUMMER: 541448860014780183		
Revisie: A	Kouter KD	ELEKTRIEK nv Esenweg 112 8600 DIKSMUIDE BTW: BE444.242.578
Datum: 03/04/2017	Kouterdreef 31/201	
APP.NR.: KD3.3.	9000 Gent	
Werfnr: 14023		



