

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 06/11/2025 **Inspecteur:** Michel Mergan **Mentor:** **Installateur:** Ge solutions
ID-label: **Klantreferentie:**

B.T.W. nr.: BE 0890 117 926

Merk en type meettoestel: Metrel
Eurotest ET61557

Serienummer: 19481286

Datum verslag: 06/11/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Drongensesteenweg
Huisnummer 87
Busnummer
Postcode 9000
Gemeente GENT
Land België

Eigenaar

Naam DWK David Company
Straatnaam Drongensesteenweg
Huisnummer 87
Busnummer
Postcode 9000
Gemeente GENT
Land België

Installateur

Naam Ge Solutions
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 54



Teller Nr. : 1SAG1100433002

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 2 Aantal kringen: 15
Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 0.846 MΩ RE: 8.67 Ω

OK OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	15	OK	OK

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
30	40	A-G	22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40	I-P	22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N13 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.
- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N24 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.
- N38 Toestellen niet geplaatst op moment van controle. Maximaal vermogen kon niet worden nagekeken ter bepaling van het gebruik van de kring (Boek 1 onderafdeling 5.2.1.2.)
- N4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.
- N5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

BESLUIT

- ☒
- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 6/11/2050

☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 10

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 11:00 tot 11:31

De inspecteur Michel Mergan


Mergan Michel - ACEG


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 6/11/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

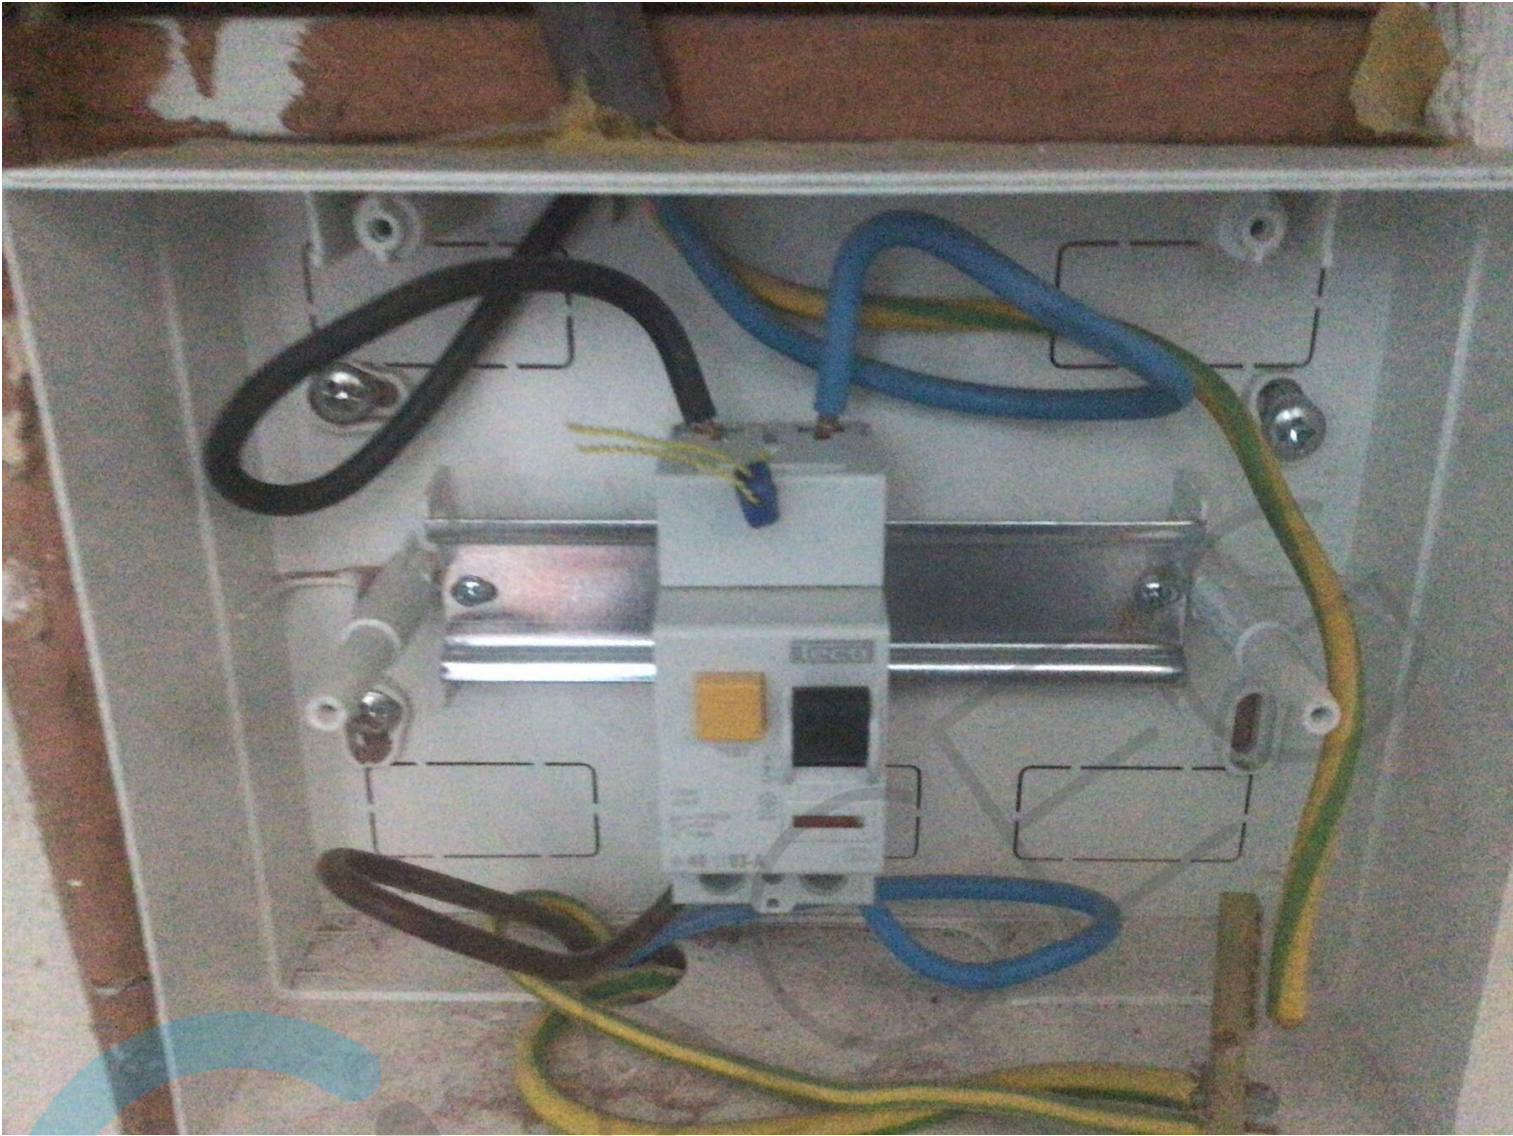

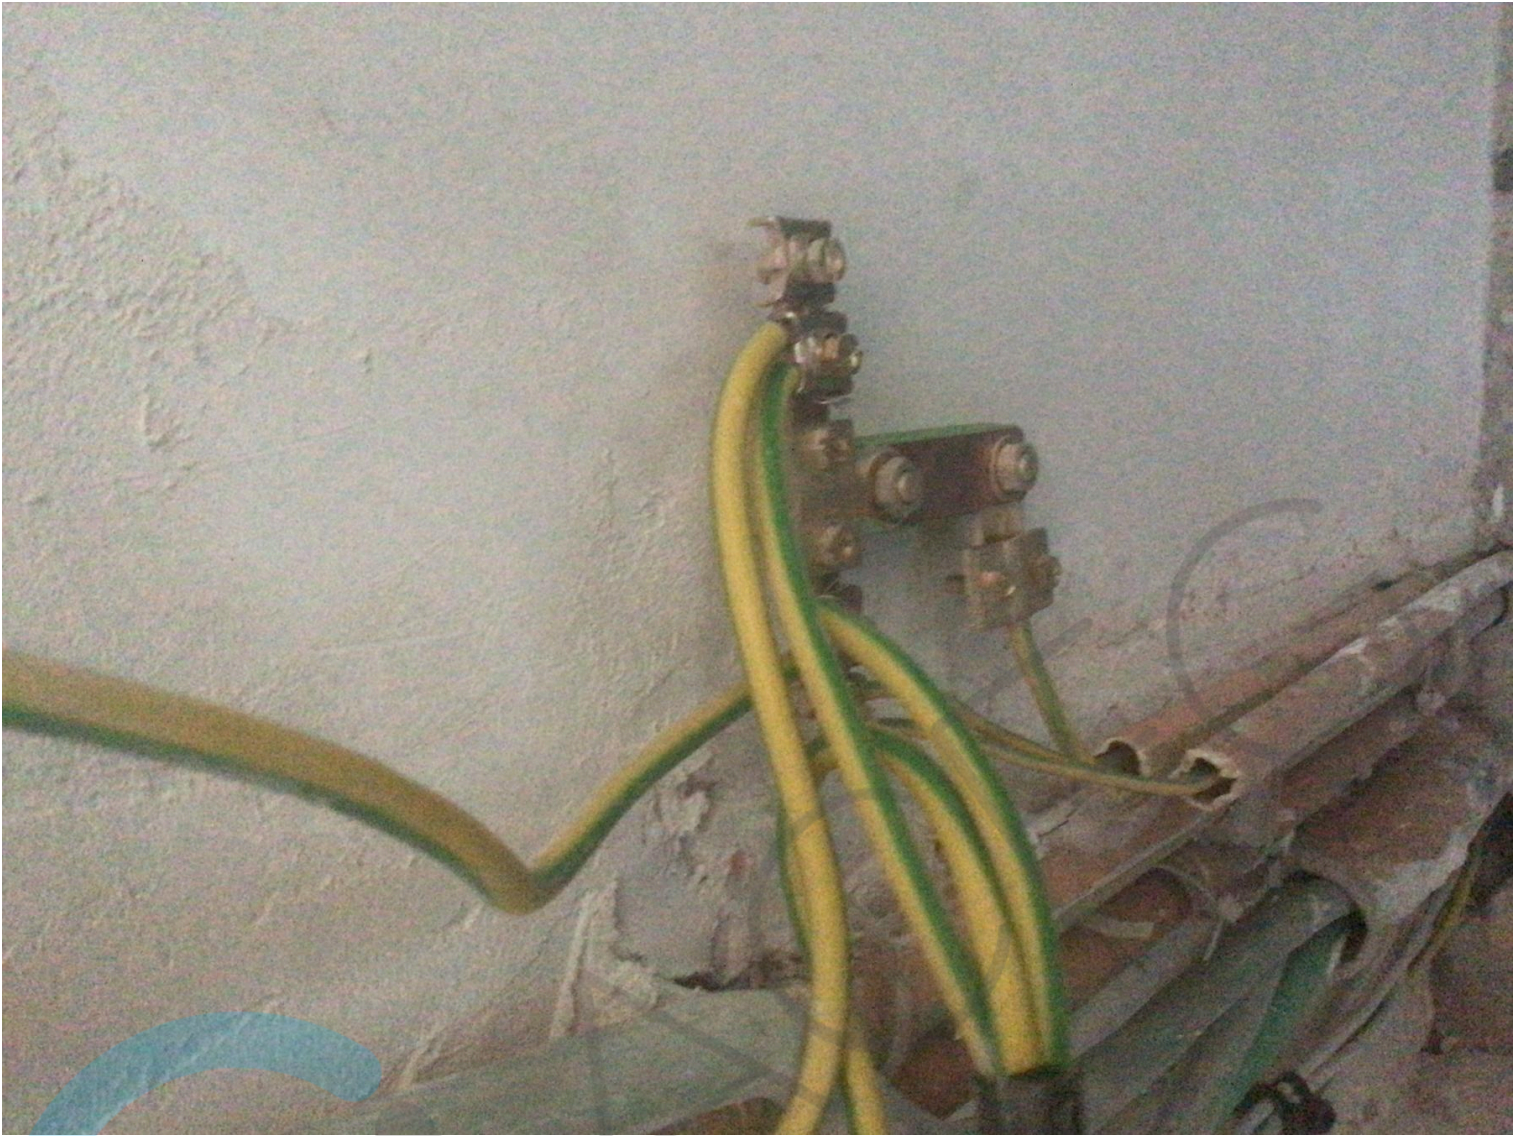

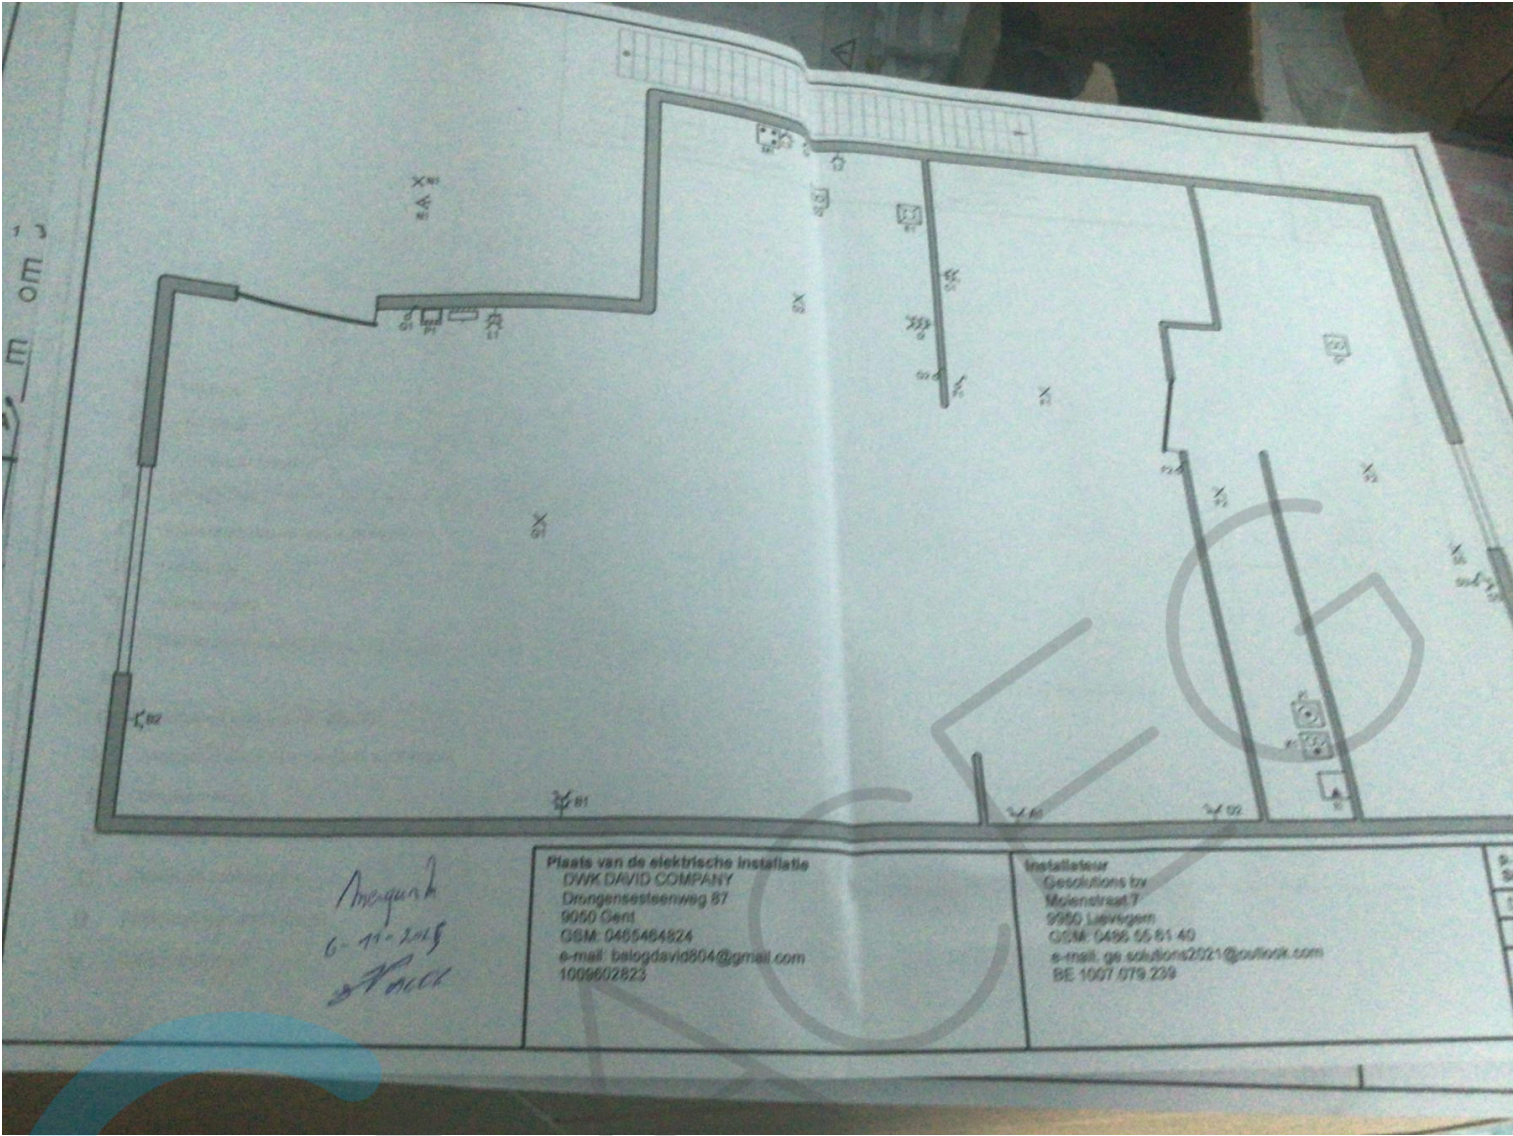

- A** stopcontact slp 1
- B** Stopcontacten woonkamer
- C** slaapkamer stopcontact
- D** Stopcontacten keuken slaapkamer badkamer verlichting spiegel
- E** Vaatwasmachine
- F** Verlichting Badkamer berging slaapkamer
- G** Verlichting woonkamer keuken
- H**
- I** Stopcontacten keuken
- J** Wasmachine
- K** Droogkast
- L** Stopcontacten keuken + woonkamer
- M** Kookfornuis
- N** Verlichting Gang
- O** Ventilator
- P** Parlofon



Installateur
Gesolutions bv
Molenstraat 7
9950 Lievegem
GSM: 0486 55 61 40
e-mail: ge.solutions2021@outlook.com
BE 1007.079.239

p. 1/4
Eendraadschema
Datum: 03/11/2022
2 x 230V - 50Hz
V 2025-11-04 15:

