



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 25/05/2023

Inspecteur: Michel Mergan

Mentor:

Installateur: Vyncke BV

ID-label:

B.T.W. nr.:-

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19481242

Datum verslag: 25/05/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Onderstraat
Huisnummer	75
Busnummer	201
Postcode	9000
Gemeente	Gent
Land	België

Eigenaar

Naam	Trust bvba
Straatnaam	Onderstraat
Huisnummer	75
Busnummer	201
Postcode	9000
Gemeente	Gent
Land	België

Installateur

Naam	Vyncke
BTW nr.	0659757970
Telefoonnummer	
E-mail	-

Type : appartement

EAN : 541448860021729892

Teller Nr.: : 1SAG3105013162

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 15


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

Ri algemeen: 21.0 MΩ

RE: 21 Ω

OK

OK

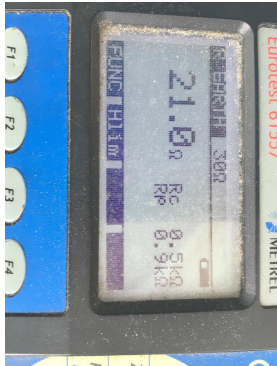

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40	Teller lokaal	22,5kA2s (3000A)	A	15	-	-
30	40	App	22,5kA2s (3000A)	A	15	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	C	16		2	1,5
6	C	16		2	2,5
1	C	16	Reserve	2	-
7	C	20		2	2,5
1	C	25		4	6

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

Extra vermogensscheider geplaatst voor laadpunt elektrische fiets, leidingen nog niet geplaatst op moment der controle

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 25/5/2048
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 10

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Michel Mergan



Mergan Michel - ACEG

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 25/5/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

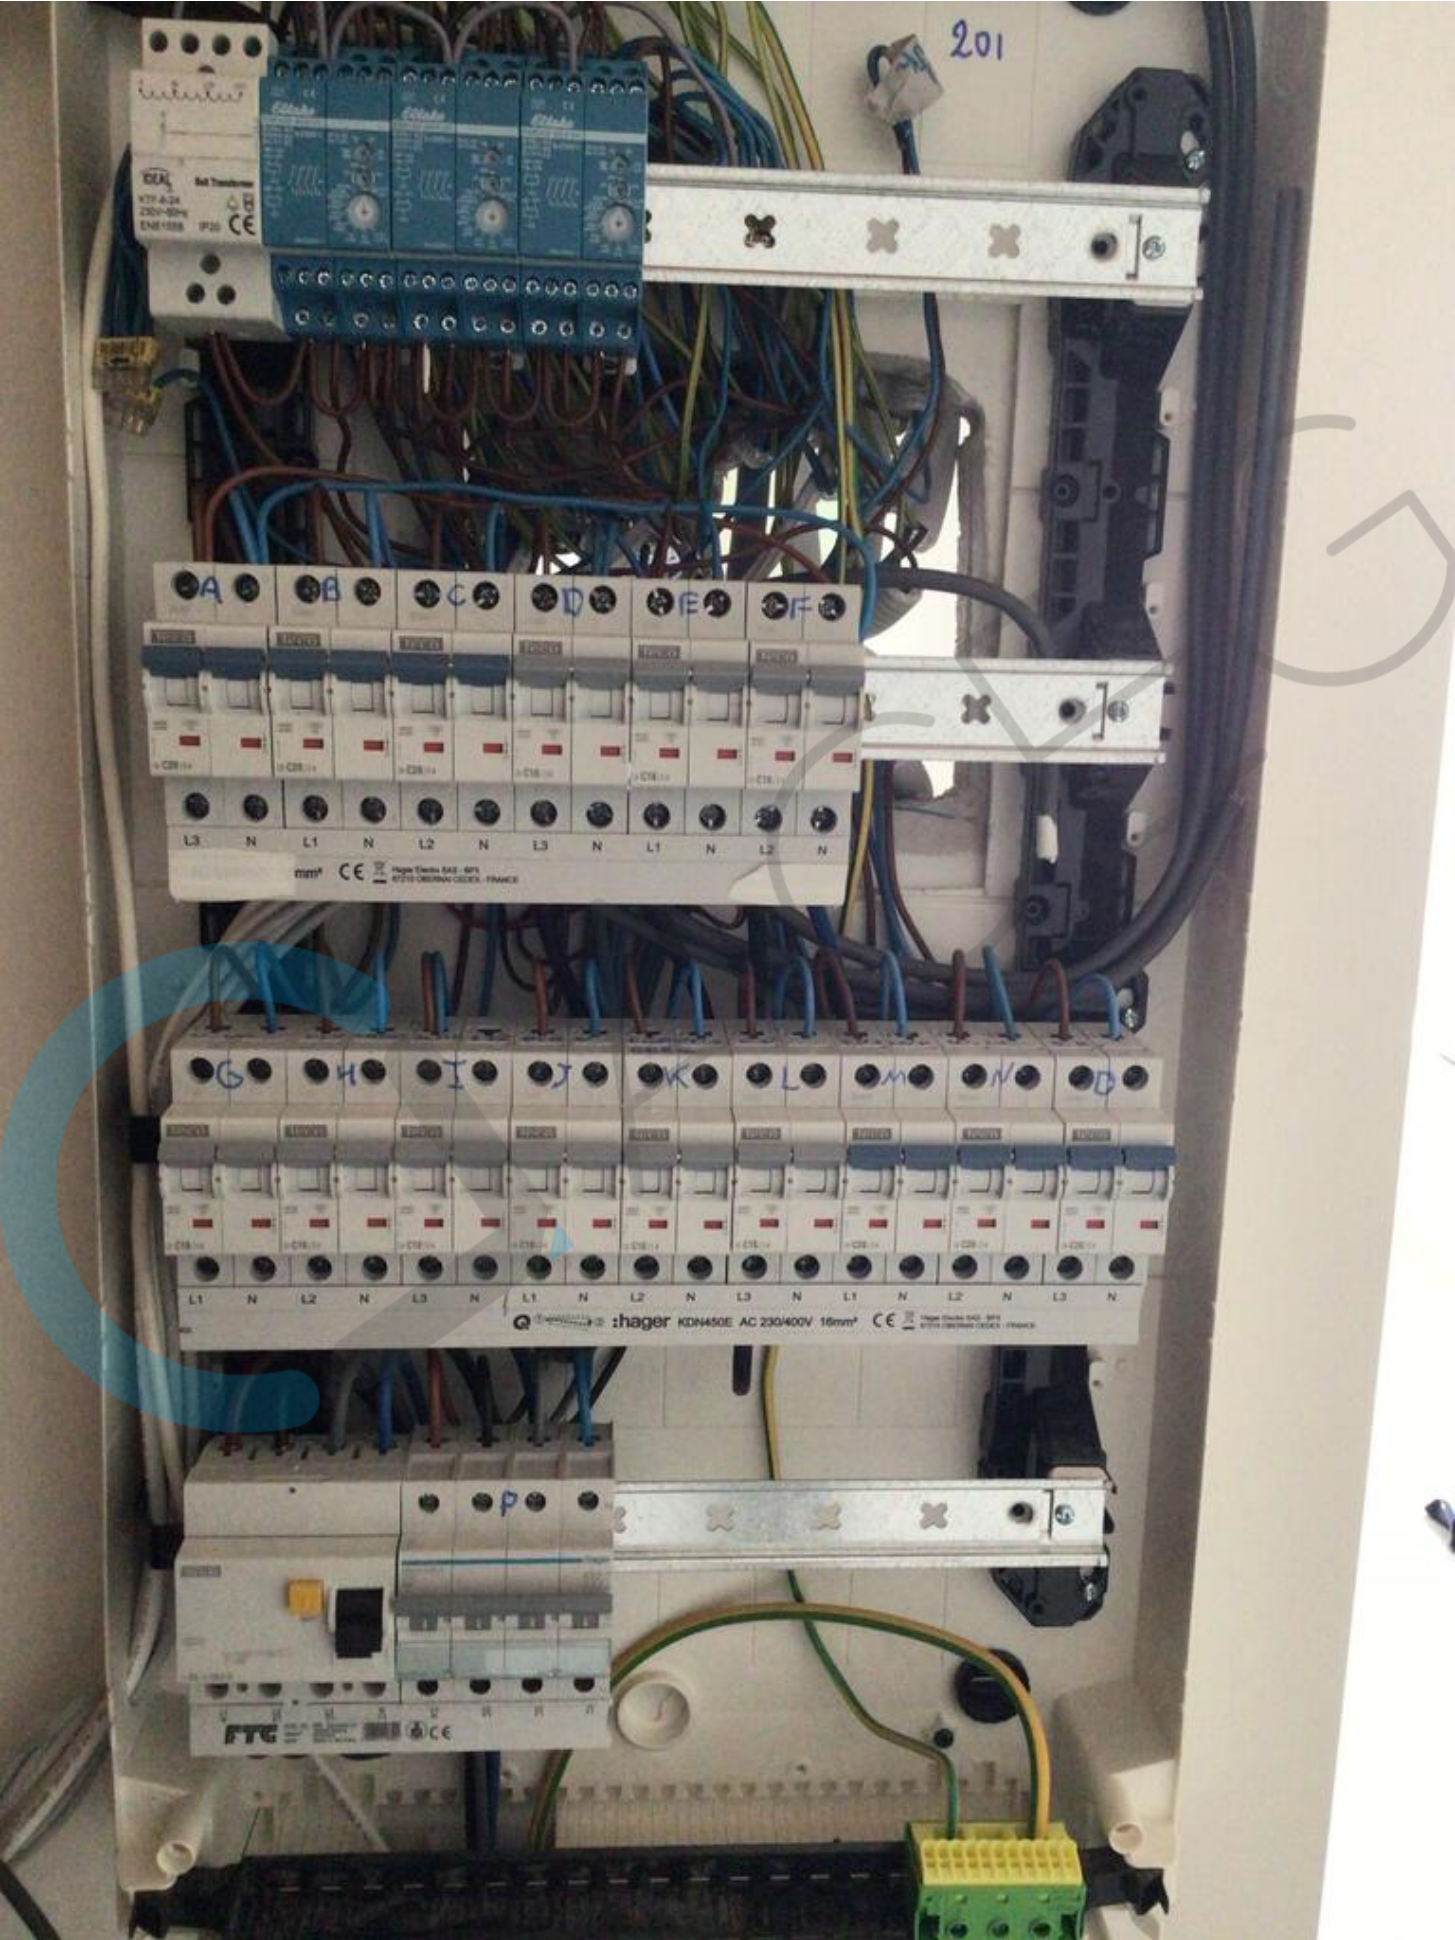



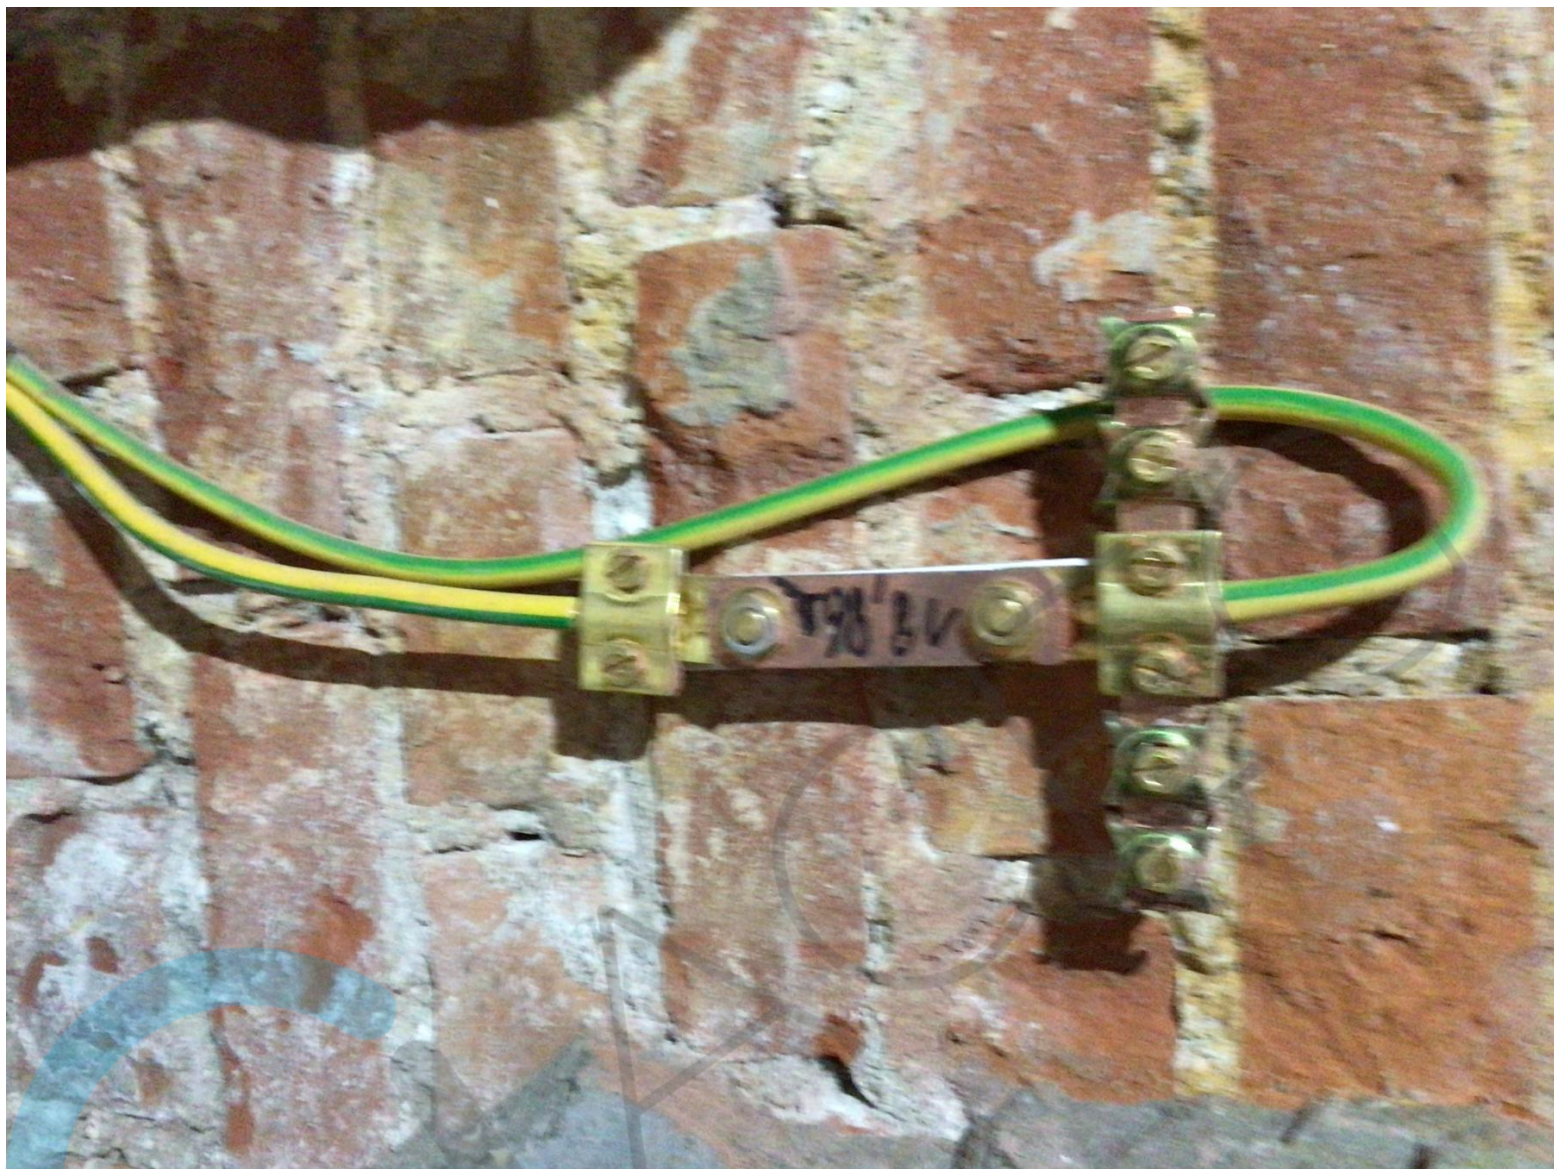

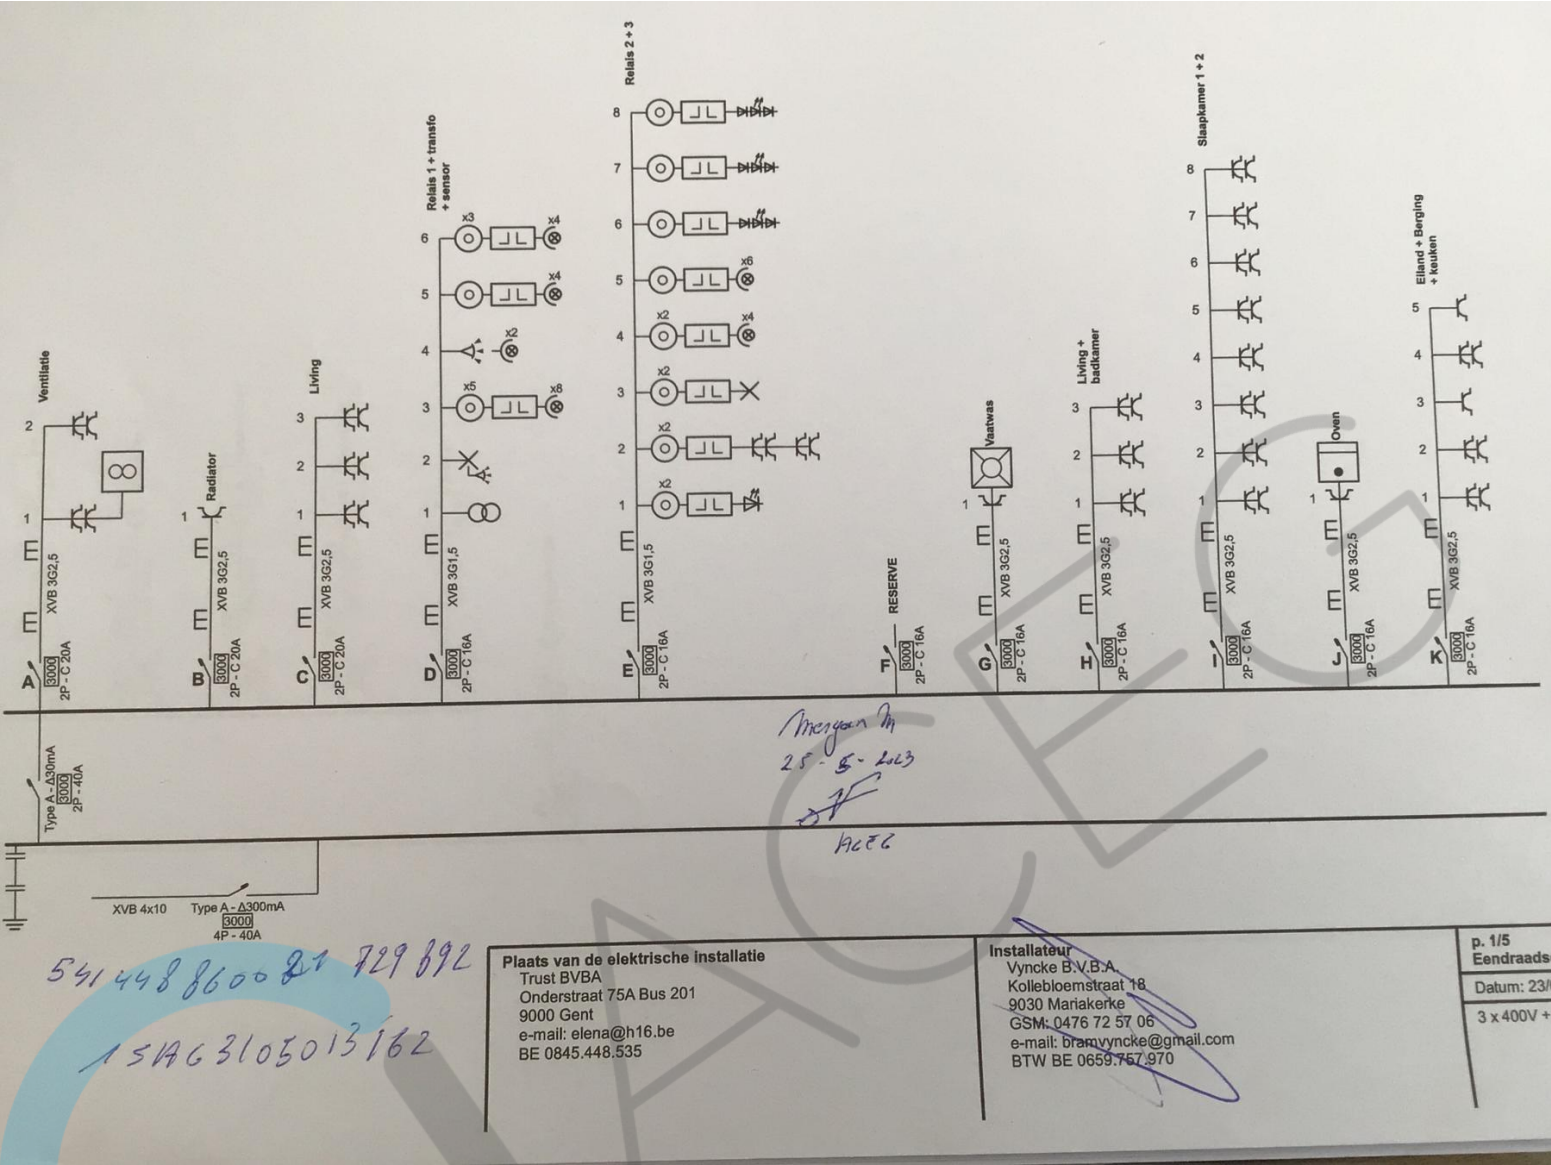

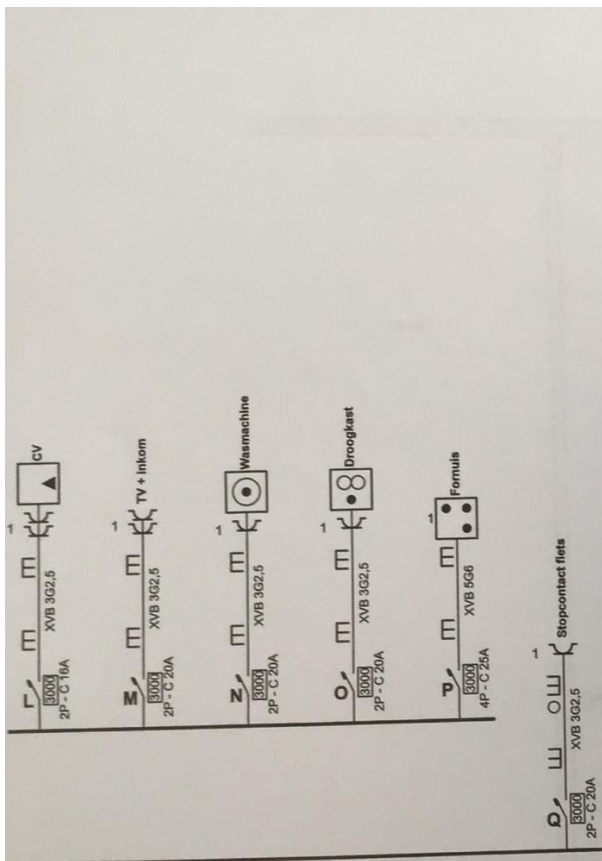


Bram Vyncke
25-5-2023
ACE

Plaats van de elektrische installatie
Trust BVBA
Onderstraat 75A Bus 201
9000 Gent
e-mail: elena@h16.be
BE 0845.448.535

Installateur
Vyncke B.V.B.A.
Kollebloemstraat 18
9030 Mariakerke
GSM: 0476 72 57 06
e-mail: bramvyncke@gmail.com
BTW BE 0659.757.970

p. 2/5
Eend
Datum
3 x 4

Onderstraat 75A Bus 201 appartement nr. 2.0

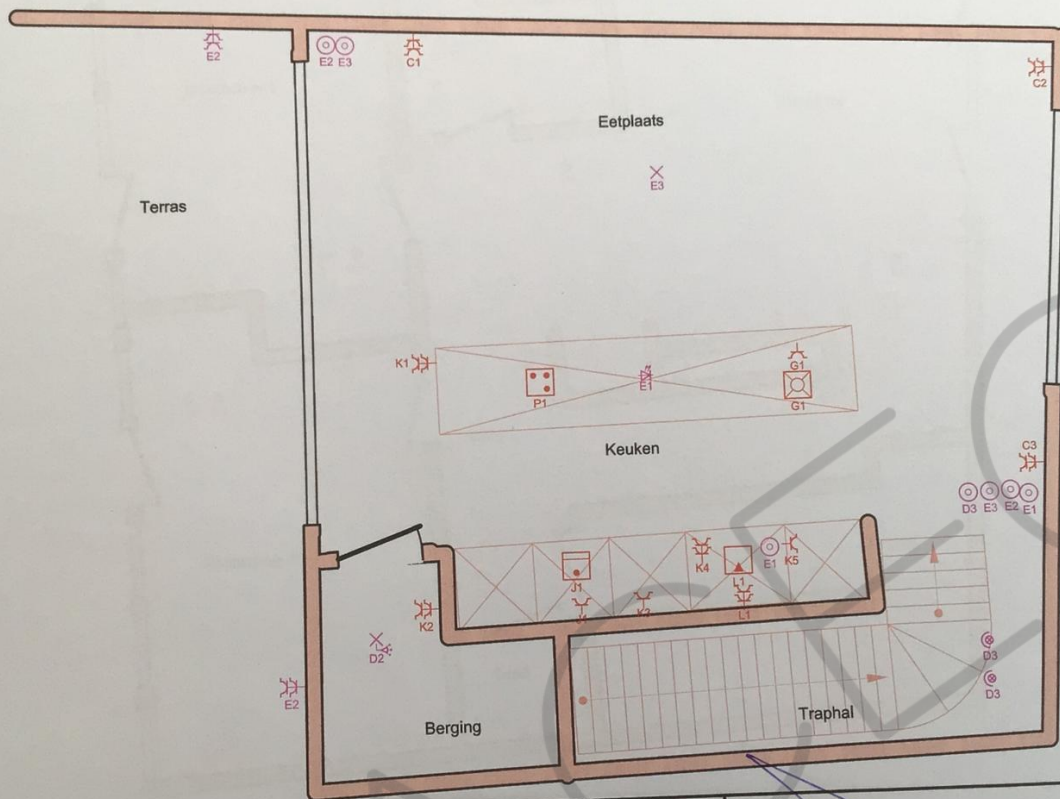


Handwritten:
25-5-2023
HCF6
[Signature]

Plaats van de elektrische installatie
Trust BVBA
Onderstraat 75A Bus 201
9000 Gent
e-mail: elena@h16.be
BE 0845.448.535

Installateur
Vyncke B.V.B.A.
Kollebloemstraat 18
9030 Mariakerke
GSM: 0476.72.57.06
e-mail: bramvyncke@gmail.com
BTW BE 0659.757.970

p. 3/5
Situatieschema
Datum: 23/05/2023
3 x 400V + N - 50

Onderstraat 75A bus 201 appartement niv+2/+3

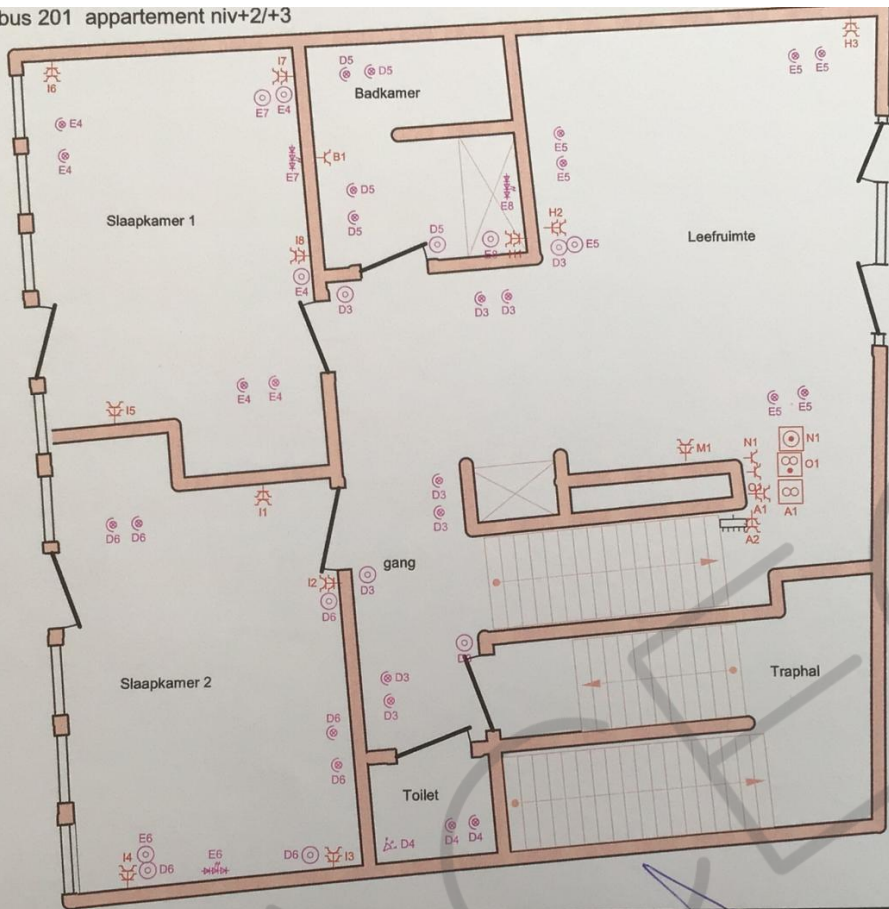

Amegari
25-5-2023
ACFG

Plaats van de elektrische installatie
Trust BVBA
Onderstraat 75A Bus 201
9000 Gent
e-mail: elena@h16.be
BE 0845.448.535

Installateur
Vyncke B.V.B.A.
Kollebloemstraat 18
9030 Mariakerke
GSM: 0476 72 57 06
e-mail: bramvyncke@gmail.com
BTW BE 0659.757.970

p. 4/5
Situatieschema
Datum: 23/05/2023
3 x 400V + N - 50Hz

- A Ventilatie
- B Radiator
- C Living
- D Relais 1 + transfo + sensor
- E Relais 2 + 3
- F RESERVE
- G Vaatwas
- H Living + badkamer
- I Slaapkamer 1 + 2
- J Oven
- K Eiland + Berging + keuken
- L CV
- M TV + inkom
- N Wasmachine
- O Droogkast
- P Fornuis
- Q Stopcontact fiets

Morgan
25-05-2023

Plaats van de elektrische installatie
Trust BVBA
Onderstraat 75A Bus 201
9000 Gent
e-mail: elena@h16.be
BE 0845.448.535

Installateur
Vyncke B.V.B.A.
Kollebloemstraat 18
9030 Mariakerke
GSM: 0476 72.57 06
e-mail: bramvyncke@gmail.com
BTW BE 0659.757.970

p. 5/5
Lijst Kringen

Datum: 23/05/20

3 x 400V + N ~ 5



