

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 01/09/2022

Inspecteur: Jurgen Goethals

Mentor:

Installateur: De Preter NV

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0879 273 326

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
Eurotest ET61557

Serienummer: 18460134

Datum verslag: 01/09/2022

Plaats van het onderzoek

Straatnaam stekenevaardeken
Huisnummer 8
Busnummer 0202
Postcode 9000
Gemeente GENT
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam stekenevaardeken
Huisnummer 8
Busnummer 0202
Postcode 9000
Gemeente GENT
Land België

Installateur

Naam De Preter NV
BTW nr. BE 0879 273 326
Telefoonnummer +32 59 31 46 73
E-mail info@depreter.eu

Type : appartement

EAN : 54

Teller Nr. : -

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 13

Ri algemeen: >0.5 MΩ


OK



Aardelektrode: Aardingslus

RE: 1.87 Ω

OK

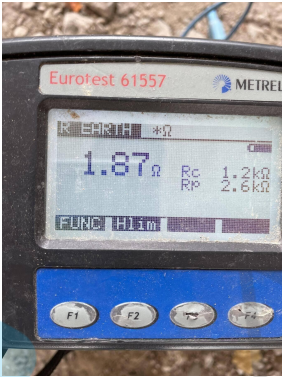

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	13	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	C	16		2	1,5
1	C	32		2	6
10	C	20		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 1/9/2047

- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..


Aantal bijlage(n):
VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG
De inspecteur Jurgen Goethals

Goethals Jurgen

- Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**
- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 - Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
 - Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechteerks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
- Kwaliteit**
- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
 - De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be 02 880 88 90 BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 1/9/2047	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

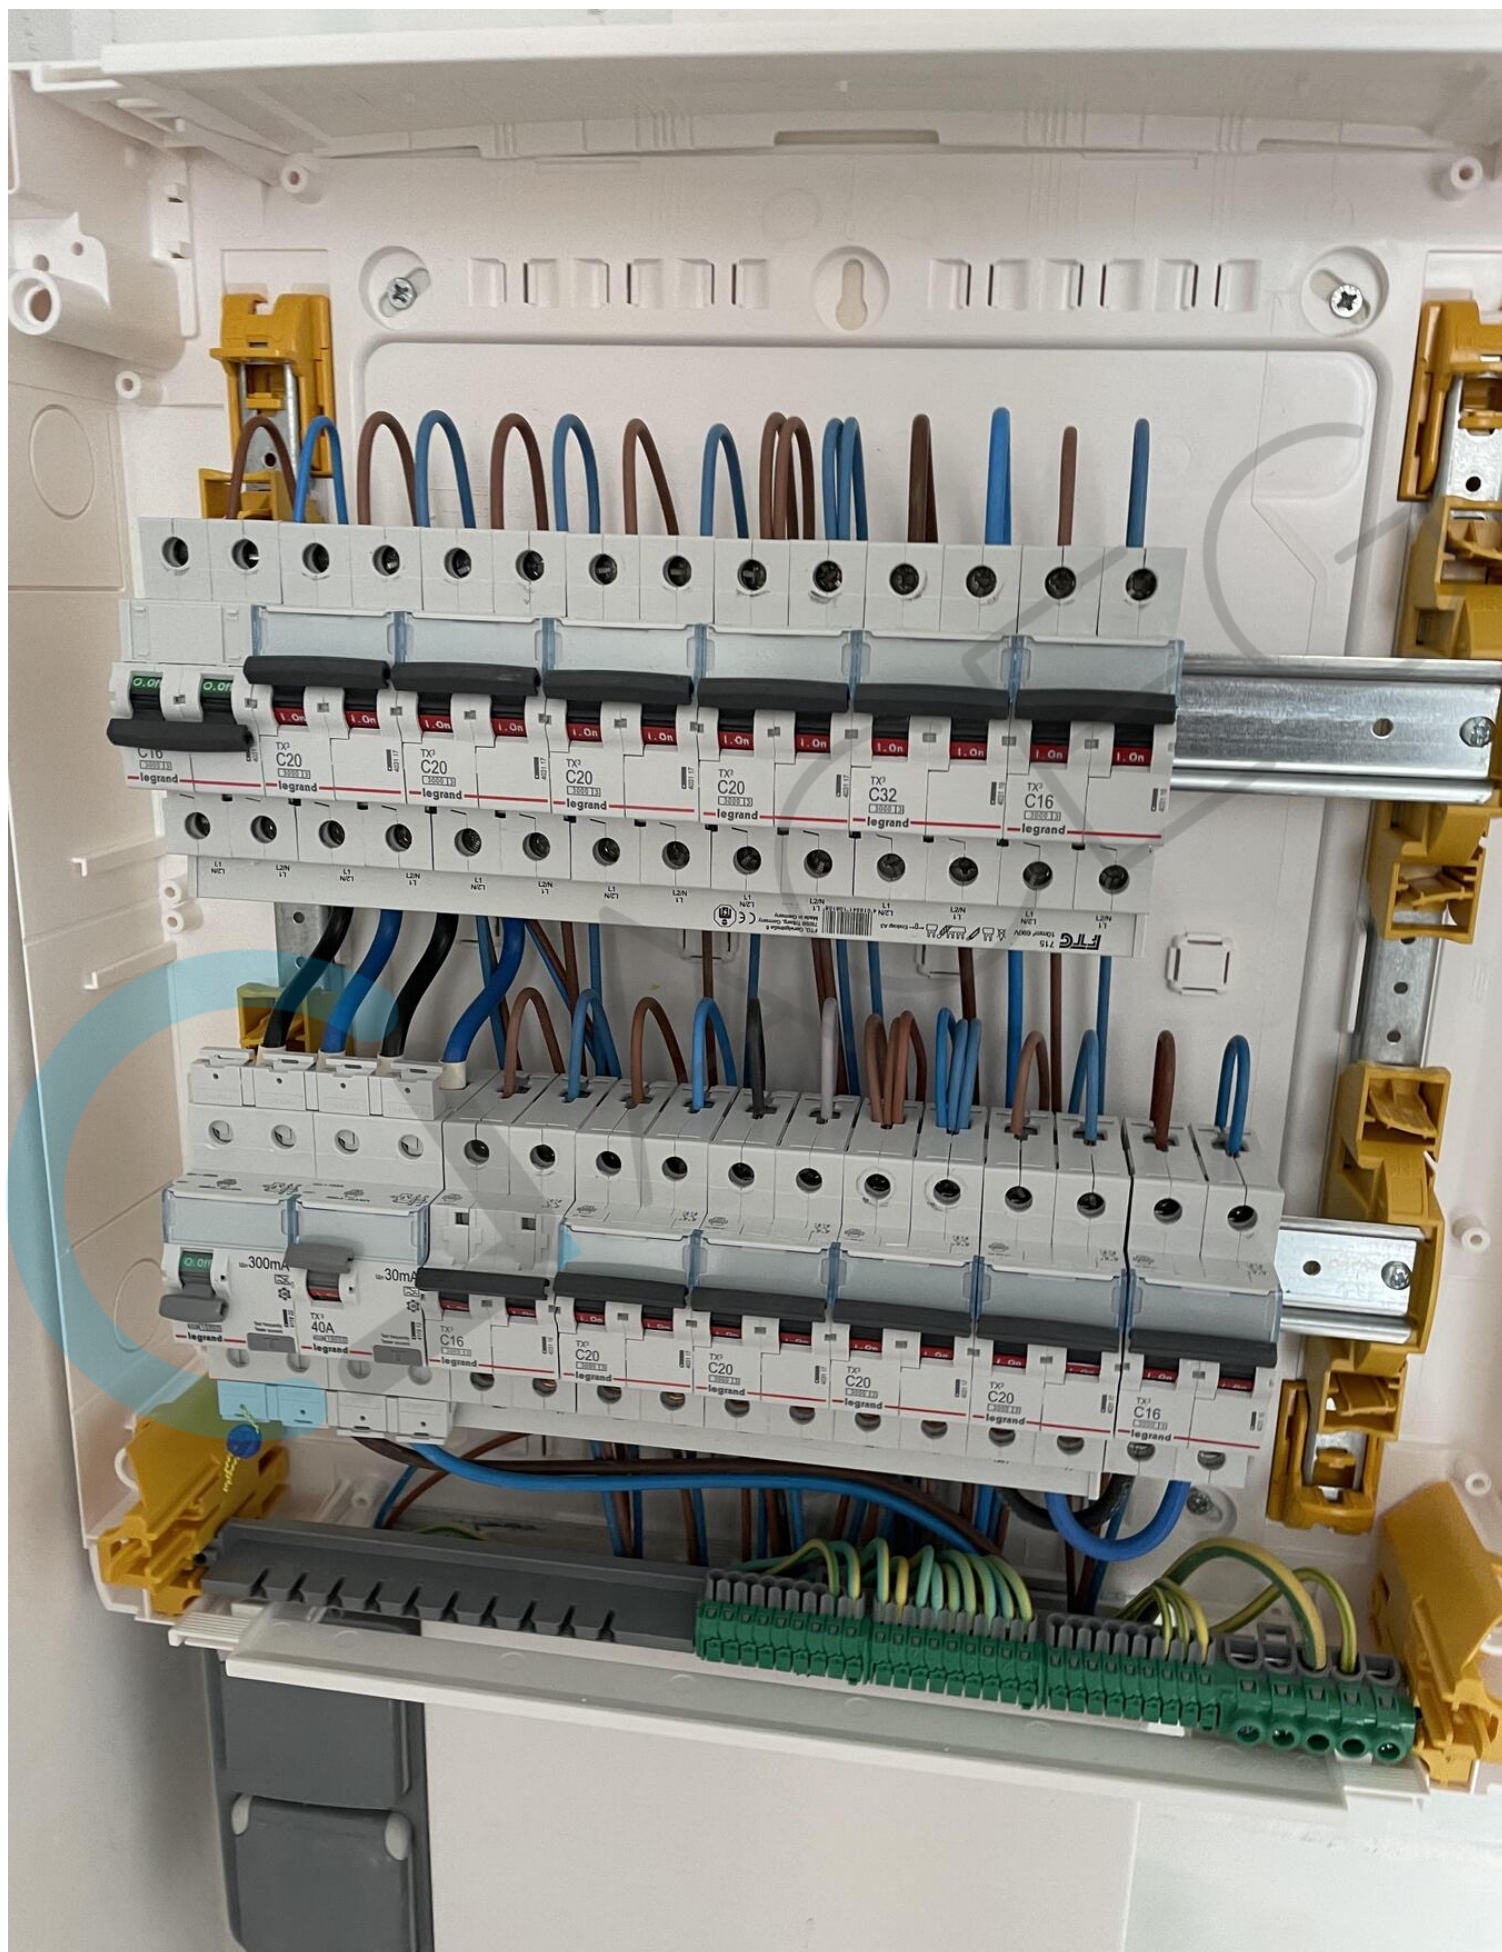



CHANCEEG

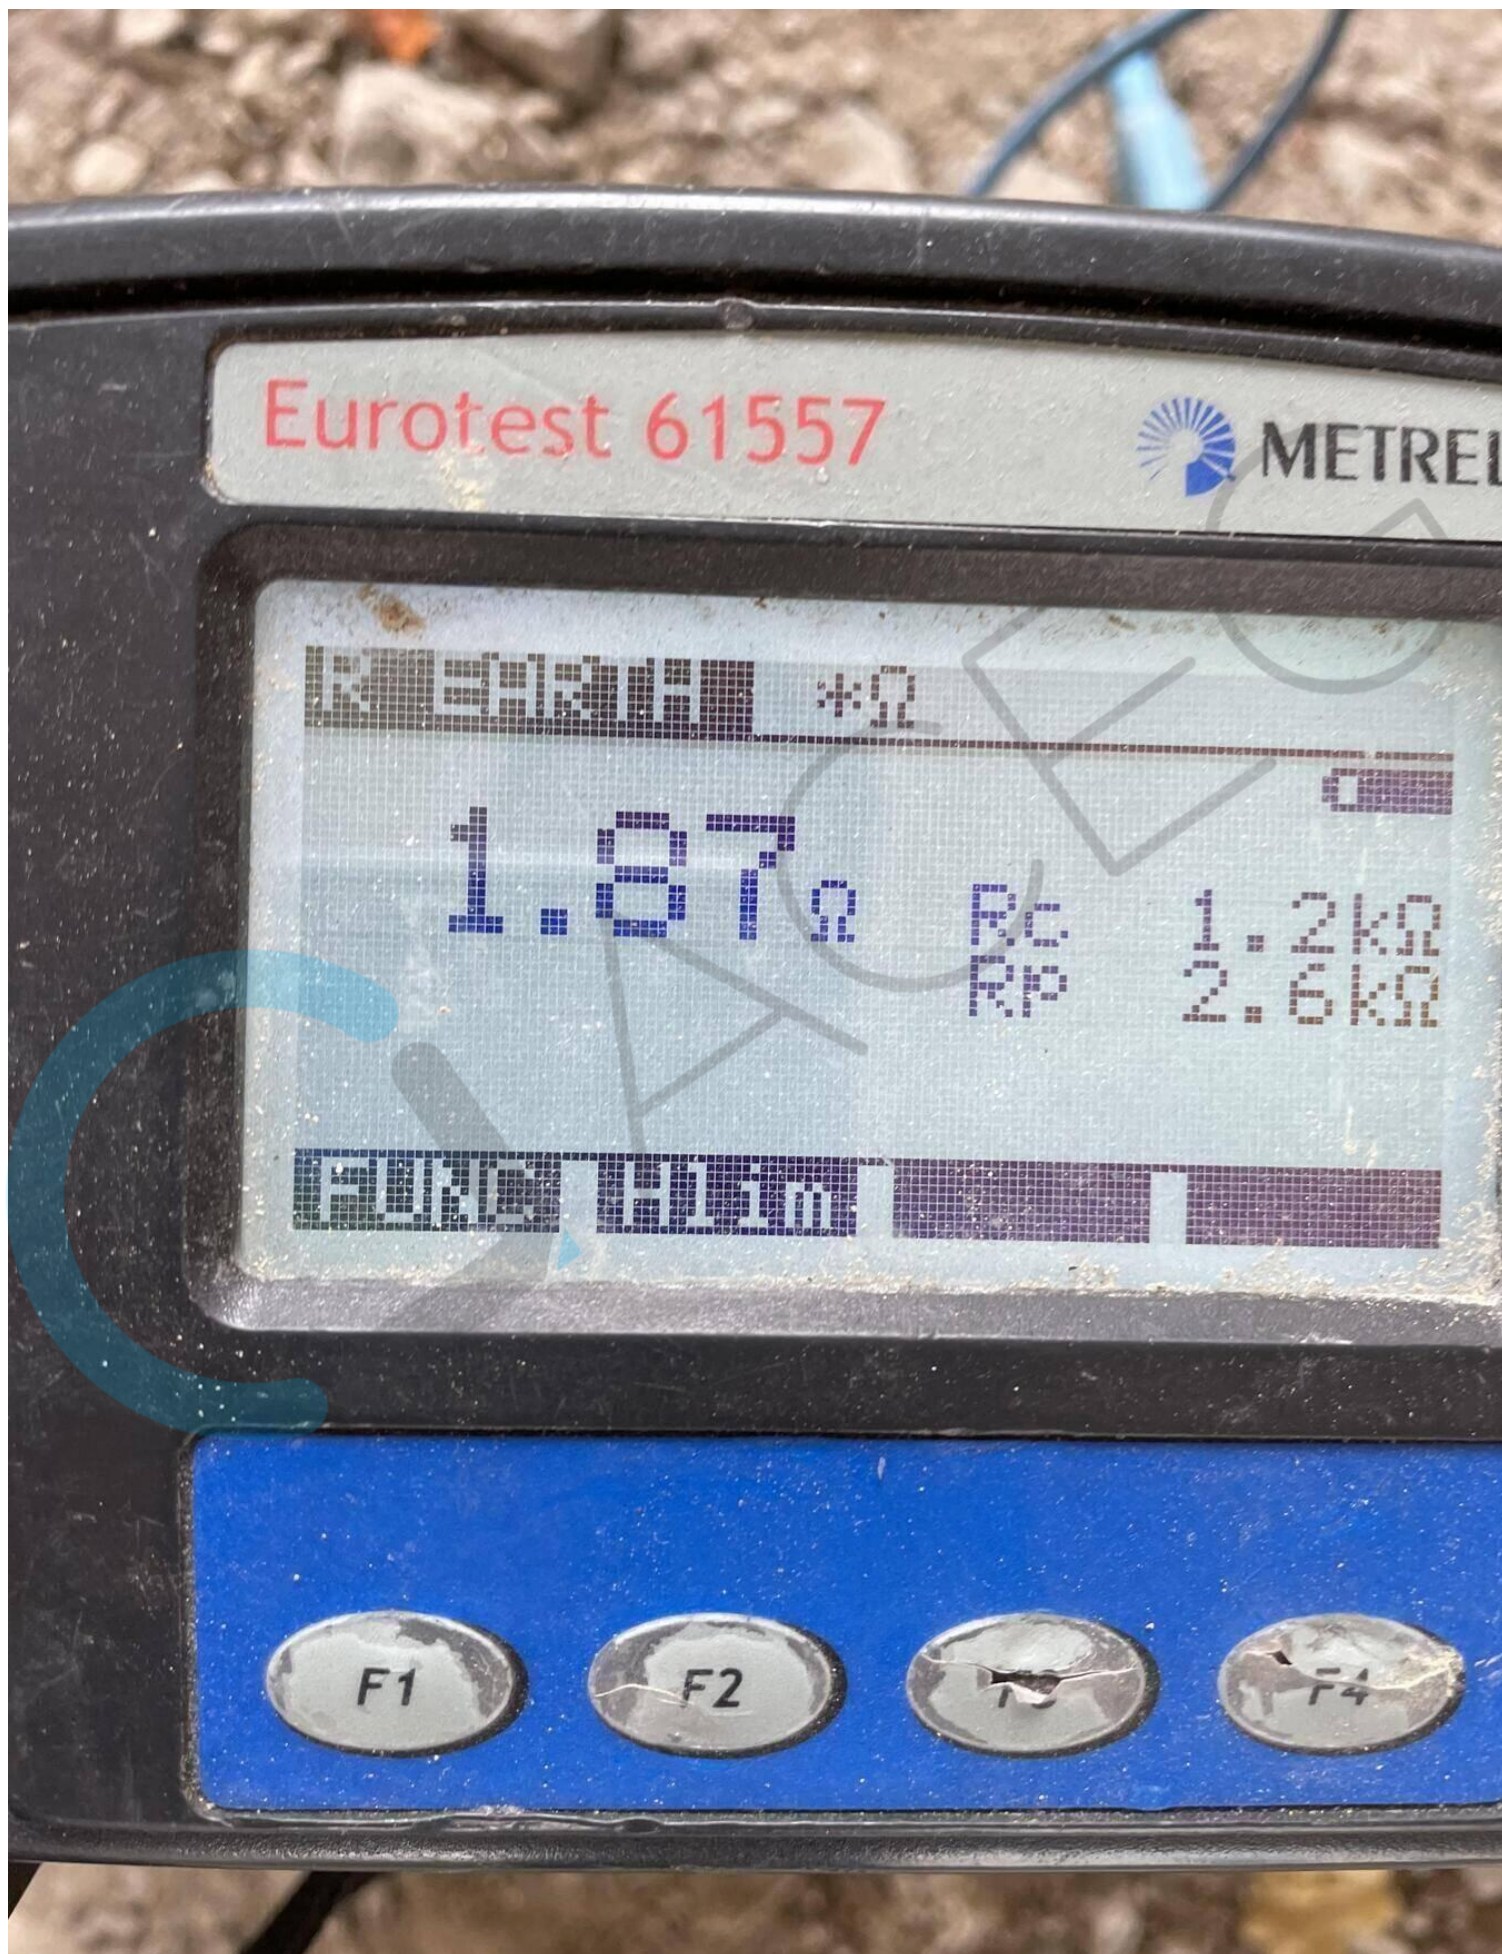



CHANCEEG






CHANCEEG

Technical drawing of a kitchen layout showing dimensions and component placement. The drawing includes the following elements:

- Dimensions:**
 - Overall width: 2340
 - Overall height: 2350
 - Section width: 1100
 - Section width: 669
 - Section width: 740
 - Section width: 960
 - Section width: 1700
 - Section width: 1040
 - Section width: 330
 - Section height: 250
 - Section height: 1070
 - Section height: 600
 - Section height: 1650
 - Section height: 1050
 - Section height: 550
 - Section height: 600
 - Section height: 200
 - Section height: 400
 - Section height: 300
- Components and Labels:**
 - ZICHT A**: View A
 - ledstrip ledlab WW**: LED strip light for kitchen island
 - stopc.**: Stopcock
 - stopc. in kast**: Stopcock in cabinet
 - D6**, **D5**, **D4**, **D7**, **D2**, **D1**: Drainage points
 - Frigo**: Refrigerator
 - Vaatwas**: Dishwasher
 - K1**: Sink
 - Oven Combi-oven**: Combination oven
 - E1 tipon**: Tip-on oven
 - Loodwerk voor spoeltafel, kraan en vaatwas**: Plumbing for sink, faucet, and dishwasher
- Other Labels:**
 - 1100**, **669**, **740**, **960**, **1700**, **1040**, **330**, **250**, **1070**, **600**, **1650**, **1050**, **550**, **600**, **200**, **400**, **300**

2 x 230V ~ 50Hz

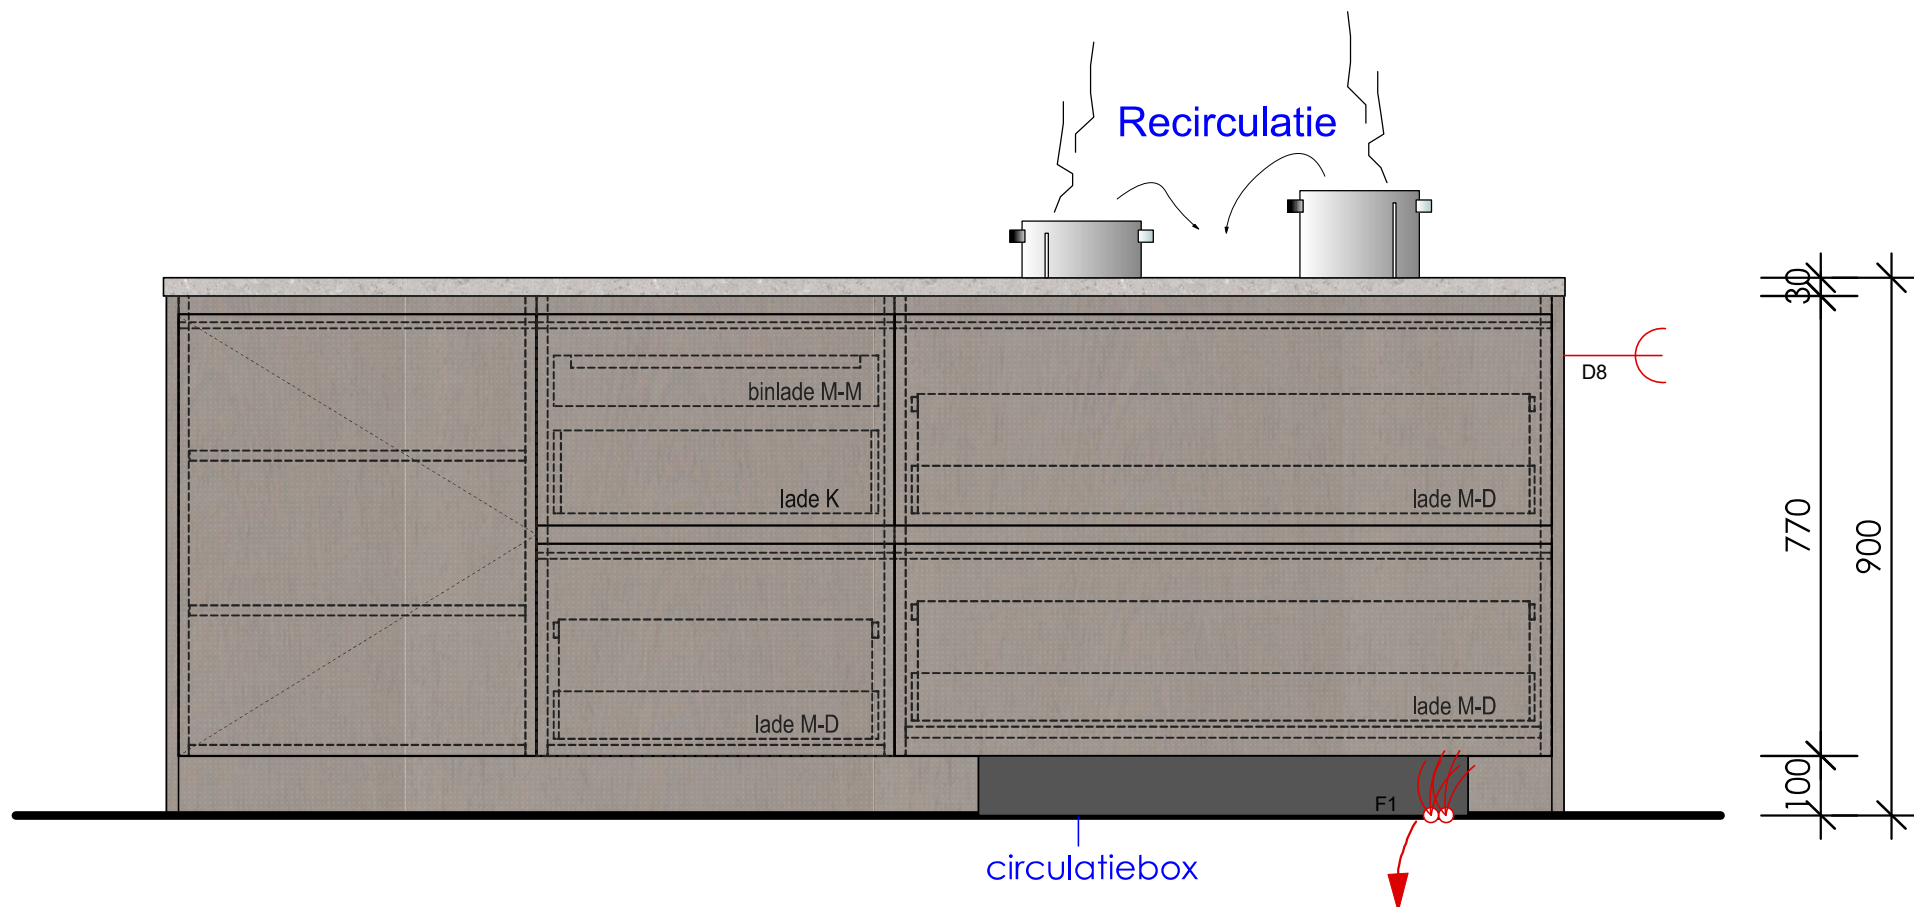

ZICHT C

Bedrading uit de vloer voor opbouwstopc.
kookplaat/ dampkap, stopc. met neusdeksel
voor rechtstreekse aansluiting + voor stopc.
op zijkant van eiland - bedrading lang genoeg later

Erkend Organisme

ACEG West-Vlaanderen
Pieter Boncquetstraat 39
8870 Izegem
Tel.: 050 96 02 08
e-mail: wvl@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie

Stekenevaardeken 8 Bus 0202
9000 Gent

Installateur

G. De Preter nv
A. Brackxstraat 9
8400 Oostende
Tel.: 059 31 46 73
e-mail: info@depreter.eu
BTW BE 0879.273.326

p. 4/4

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz
